

PrIMus

Versione BIM ONE(a) - PTB

Quick Start


12/02/2019 (E.1 - R.1)

PriMus BIM ONE

Aqui está o procedimento para criar rapidamente um orçamento com PriMus BIM ONE.


Com PriMus BIM ONE é possível criar os seguintes documentos:

- **Listagem:** documento do tipo listagem/tabela de preços. O termo "listagem" indica um documento de Arquivo a partir do qual é possível adquirir Itens de Tabela de Preços; numa listagem não é possível elaborar um orçamento.
- **Projeto:** é o documento do tipo orçamento da Obra; uma vez elaborado um Projeto, é possível obter a partir do mesmo a impressão de todos os elaborados de Projeto (Tabela de Preços, Orçamento, etc.).
- **Planejamento:** inicia o procedimento guiado para criar um documento no qual realizar o planejamento, a partir de um orçamento existente.

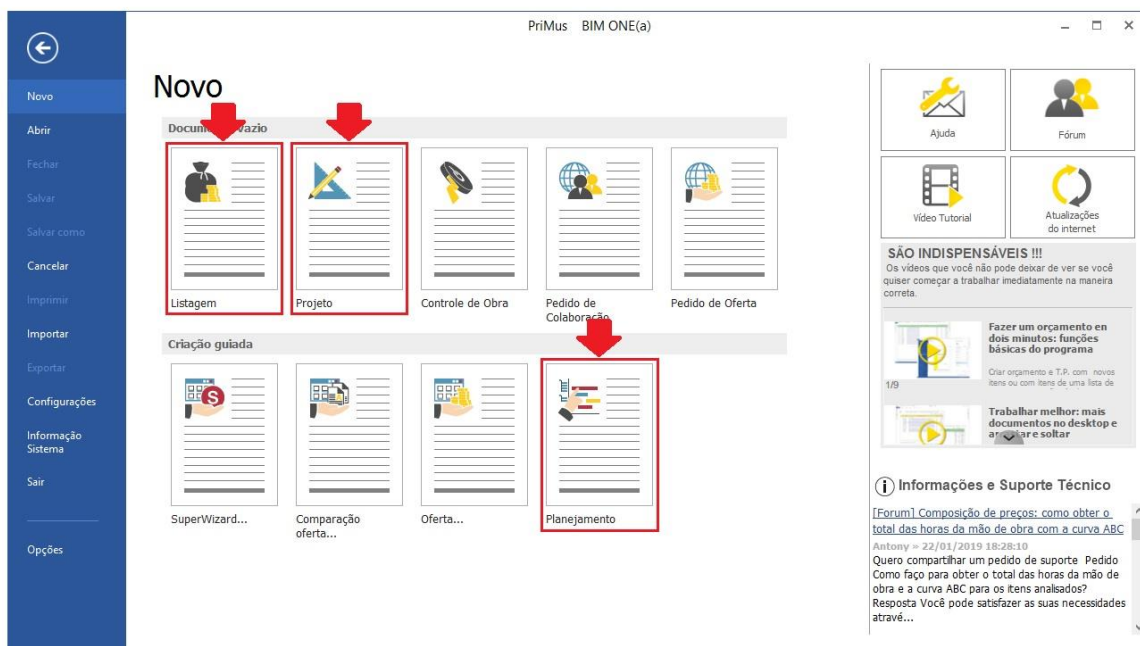


1) Criar um novo projeto

Para criar um novo documento do tipo **Projeto** (orçamento), é preciso selecionar a relacionada opção a partir da **Home** do programa.

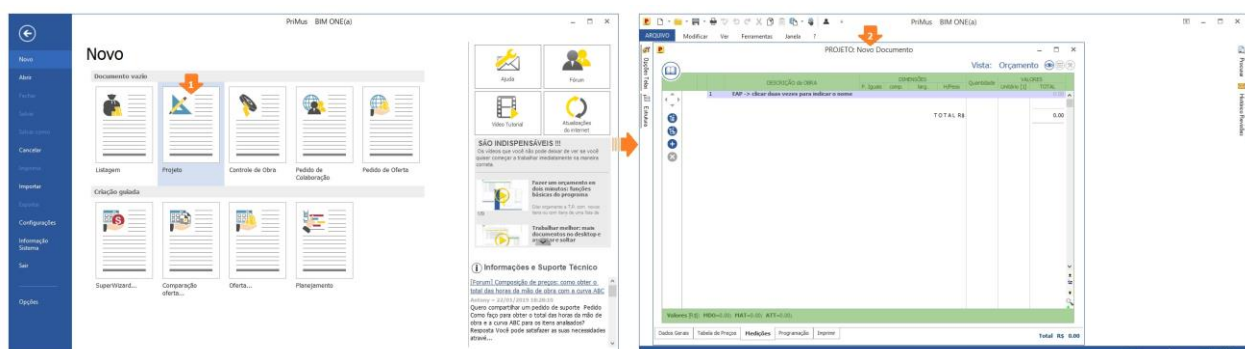

Alternativamente, selecionar a opção **Projeto** (orçamento) a partir do menu **Novo**.

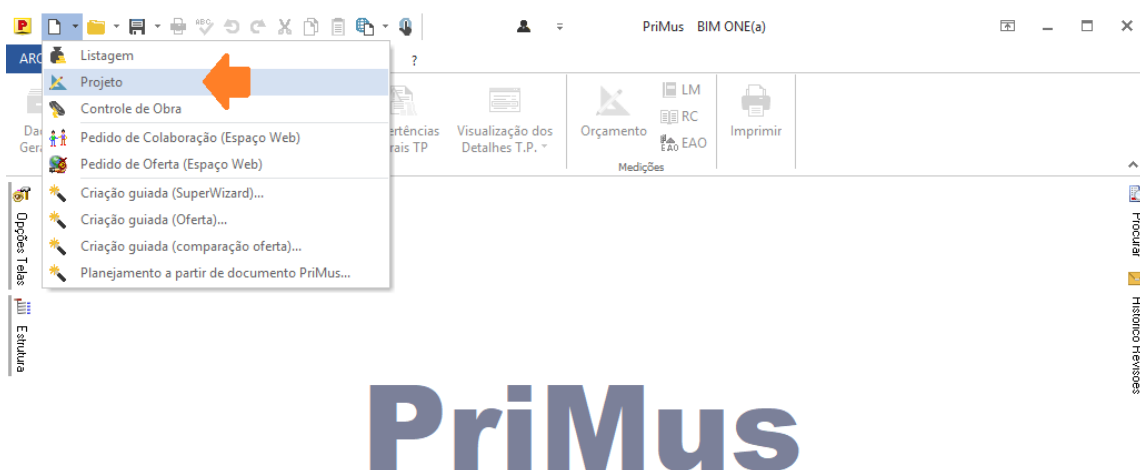


2) Os editores do documento

No documento do tipo Projeto (orçamento) de PriMus é possível visualizar rapidamente os editores do programa, que se dividem em:


- **Medições:** permite gerenciar os Itens de Medição do documento e as necessidades.
- **Tabela de Preços:** permite gerenciar os itens de Tabela de Preços, as Composições e o cálculo da Incidência da Mão de obra dos próprios itens.
- **Dados Gerais:** permite gerenciar os dados de carácter geral, o quadro econômico, a estrutura EAP para tabela de preços e orçamento, bem como definir a configuração do documento.
- **Programação:** serve para monitorar o progresso econômico da Obra na fase do projeto, das necessidades e do plano financeiro.
- **Imprimir:** permite gerenciar as Impressões de todos os documentos do projeto, tabela de preços, orçamento e composições.

3) Como criar a EAP


Utilizando os botões existentes na parte esquerda do editor, é possível [criar a partir do zero uma EAP para a Tabela de preços e o Orçamento](#), bem como a relacionada estrutura hierárquica.

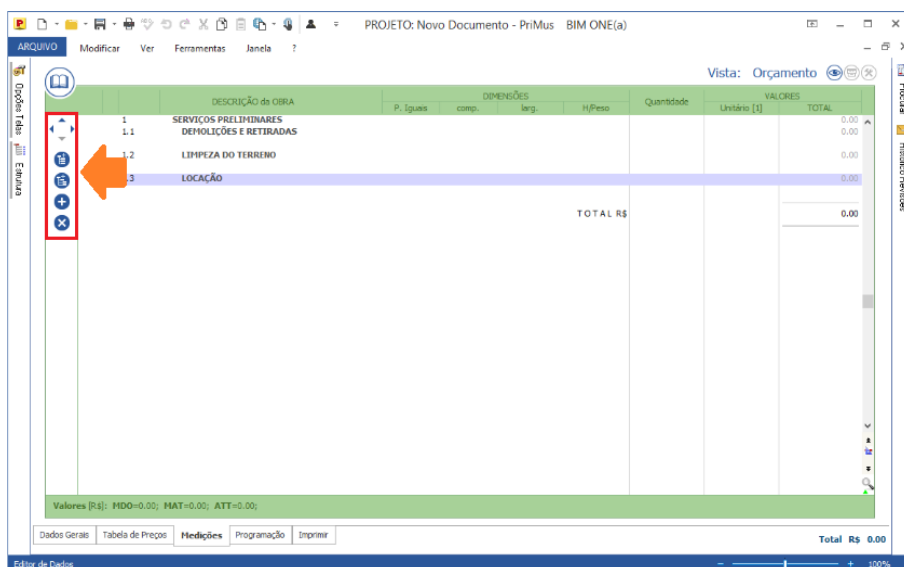

Alternativamente, é possível **adquirir a estrutura de outro documento (orçamento)** ou lista de preços como referência.

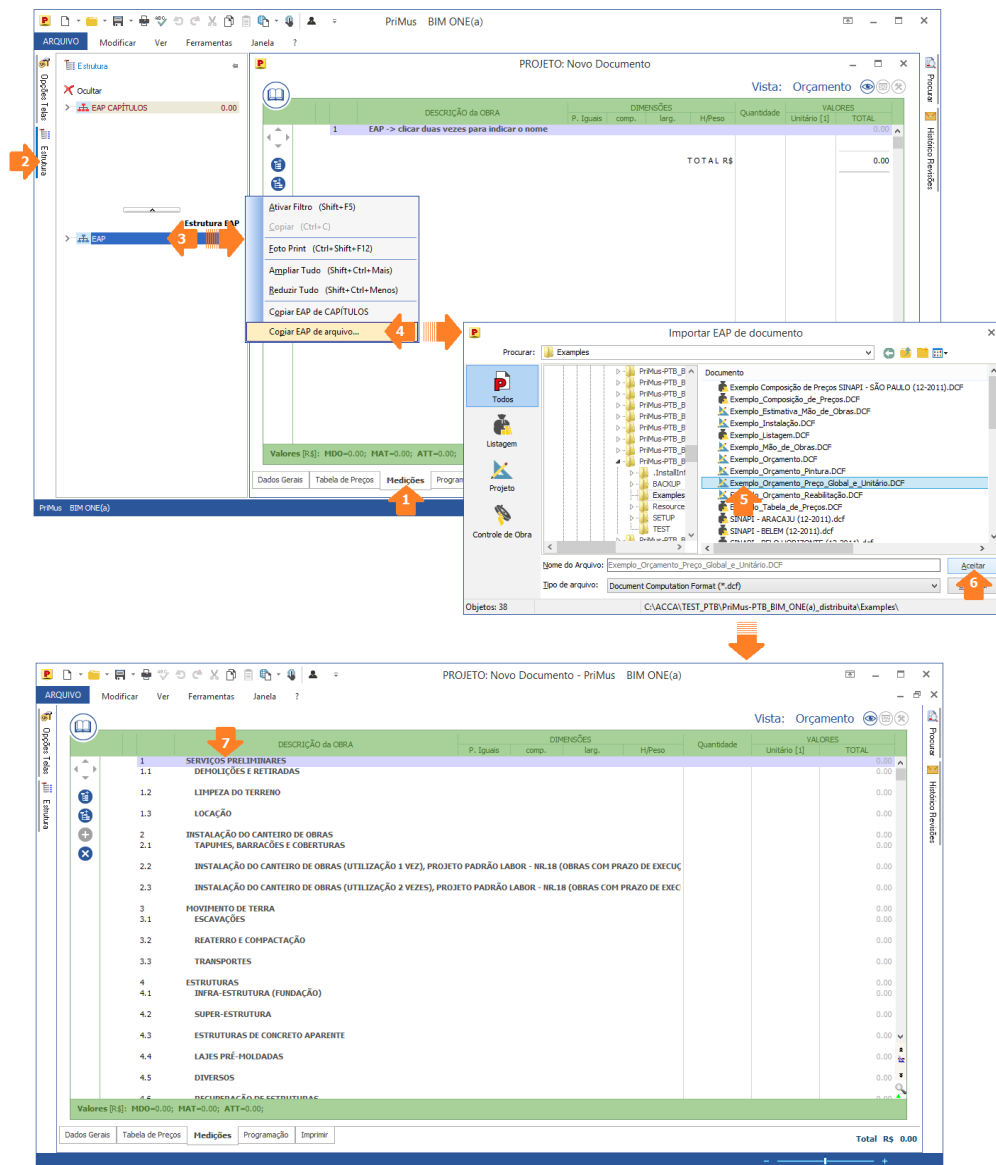


Ou através da função de arrastar e soltar.

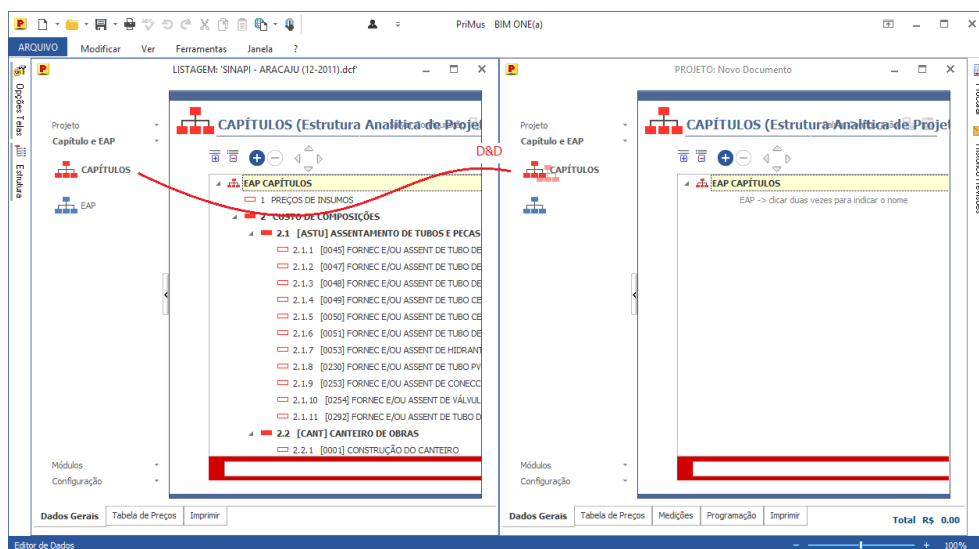


4) Inserir um item de tabela de preços (novo ou a partir de uma tabela de referência)

É possível adicionar um novo item selecionando a relacionada opção do menu local ou pressionando **INS** do teclado na **Tabela de Preços**.

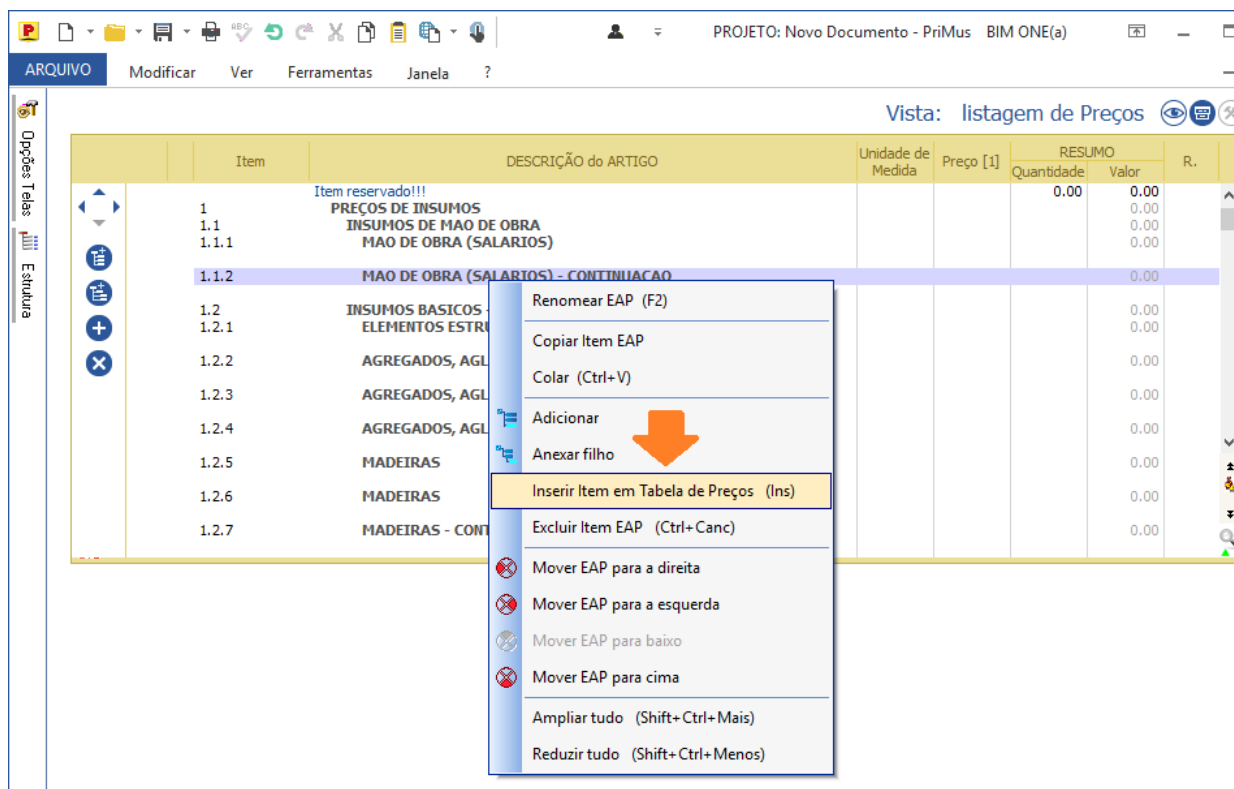

Alternativamente, é possível arrastar o item de tabela de preços de um documento para outro.

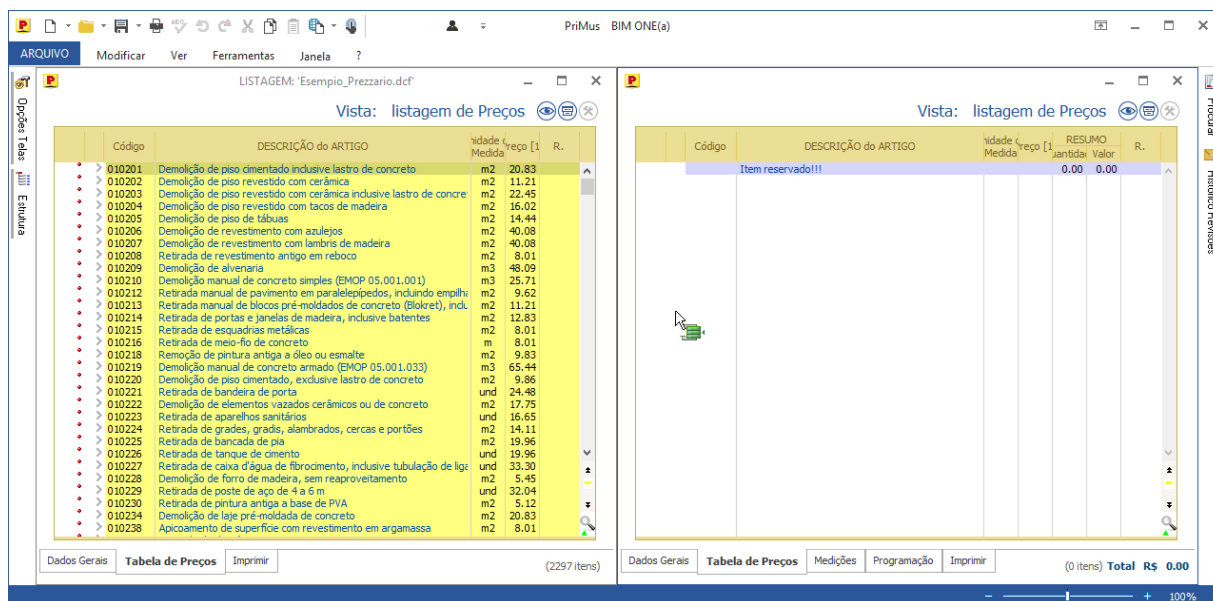


5) Editar as medições do item do orçamento e associar o item à EAP


Para **adquirir no orçamento a EAP da tabela de preços**, é preciso ativar a caixa de ferramentas estrutura no editor **Medições**.

No exemplo proposto, a EAP da tabela de preços já tinha sido definida, mas é possível copiá-la a partir de outro documento de referência (Projeto ou Tabela de Preços).


Na verdade, na caixa de ferramentas **Estrutura**, as EAP do orçamento podem ser copiadas a partir da estrutura já definida para a tabela de preços ou de outro documento.

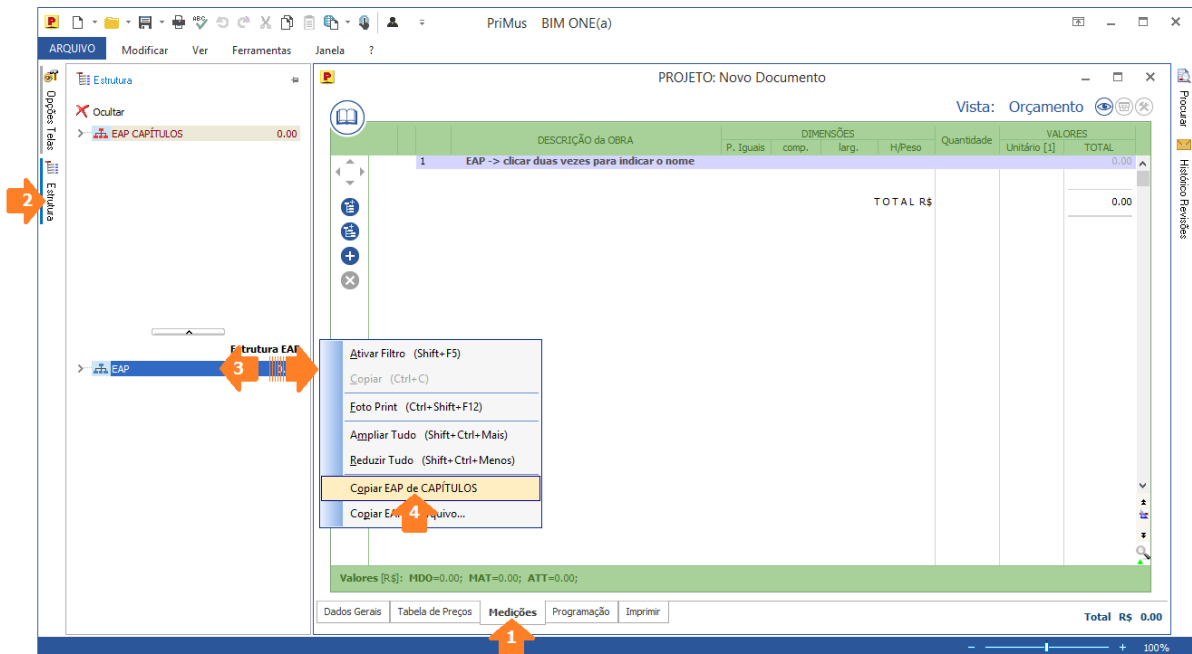

Escolhendo a segunda opção (Copiar EAP de arquivo), podemos incluir rapidamente a estrutura da tabela de preços no orçamento também.

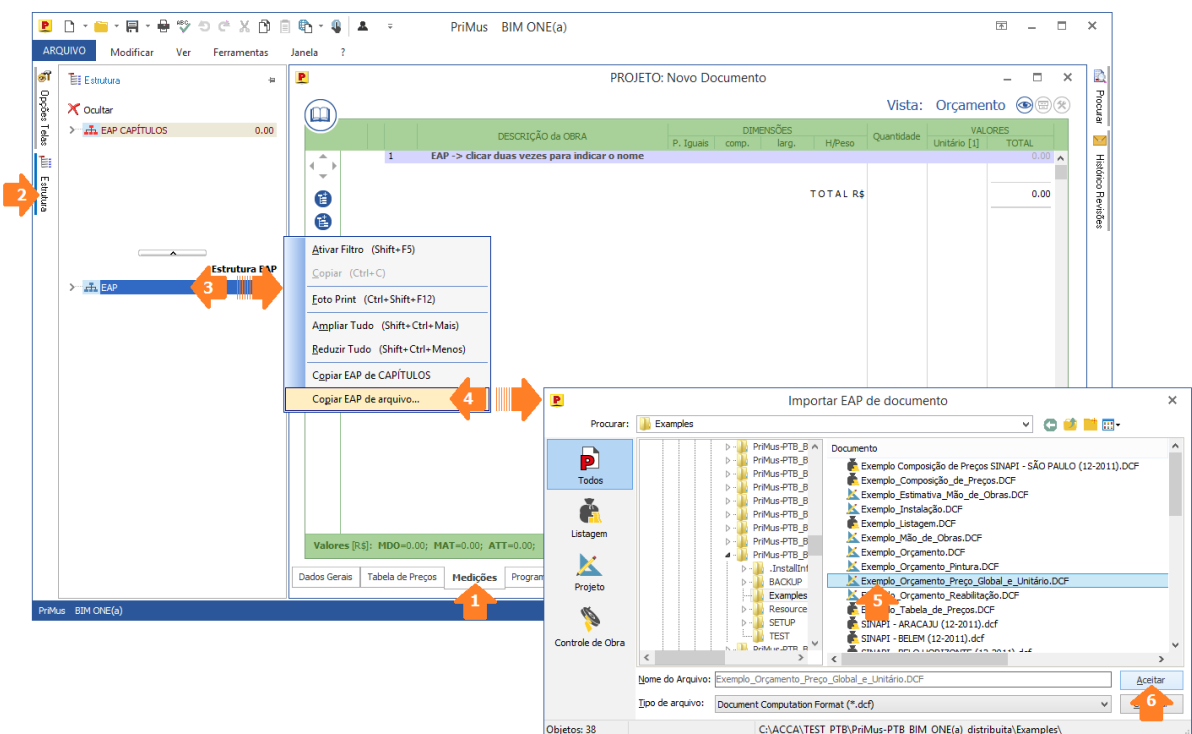

Para criar o item de orçamento, é necessário abrir a Barra a partir da **Tabela de Preços** e escolher o item a ser arrastado para o orçamento a fim de atribuí-lo à EAP.

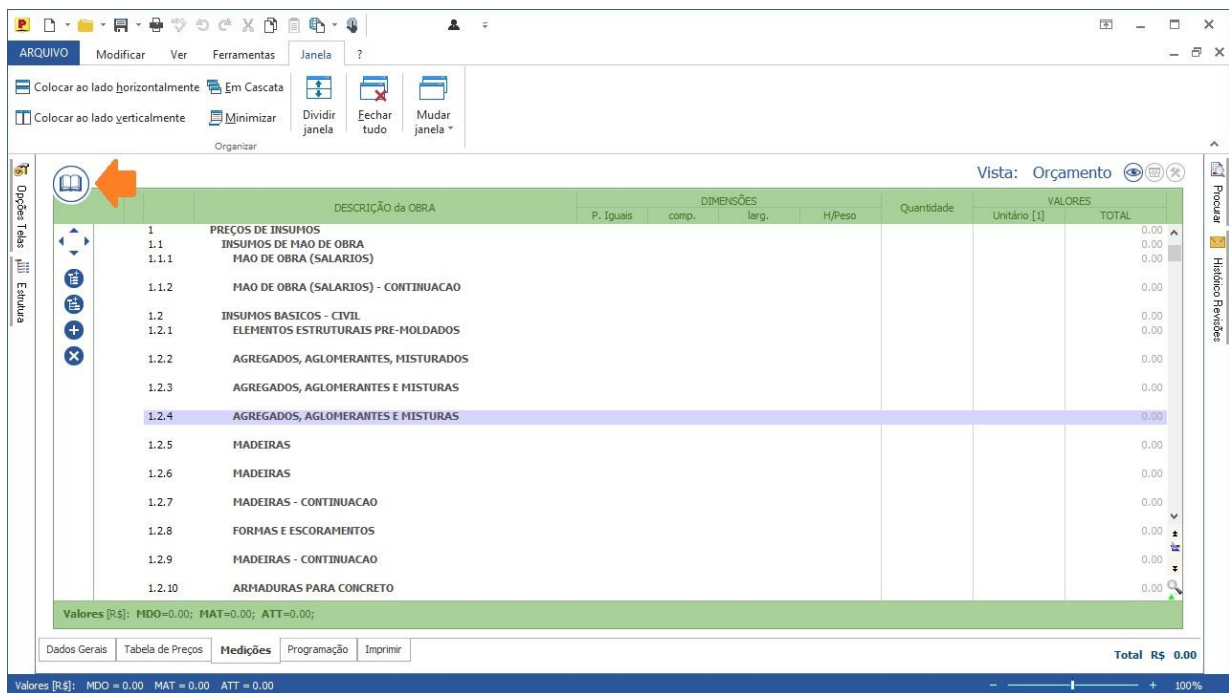


DESCRIÇÃO da OBRA		DIMENSÕES			Quantidade	VALORES	
		P. Iguais	comp.	larg.	H/Peso	Unitário [1]	TOTAL
1	PREÇOS DE INSUMOS						0.00
1.1	INSUMOS DE MAO DE OBRA						0.00
1.1.1	MAO DE OBRA (SALARIOS)						0.00
1.1.2	MAO DE OBRA (SALARIOS) - CONTINUACAO						0.00
1.2	INSUMOS BASICOS - CIVIL						0.00
1.2.1	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDADOS						0.00
1.2.2	AGREGADOS, AGLOMERANTES, MISTURADOS						0.00
1.2.3	AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS						0.00
1.2.4	AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS						0.00
1.2.5	MADEIRAS						0.00
1.2.6	MADEIRAS						0.00
1.2.7	MADEIRAS - CONTINUACAO						0.00
1.2.8	FORMAS E ESCORAMENTOS						0.00
1.2.9	MADEIRAS - CONTINUACAO						0.00
1.2.10	ARMADURAS PARA CONCRETO						0.00

Valores [R\$]: MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 0.00

Valores [R\$]: MDO = 0.00 MAT = 0.00 ATT = 0.00

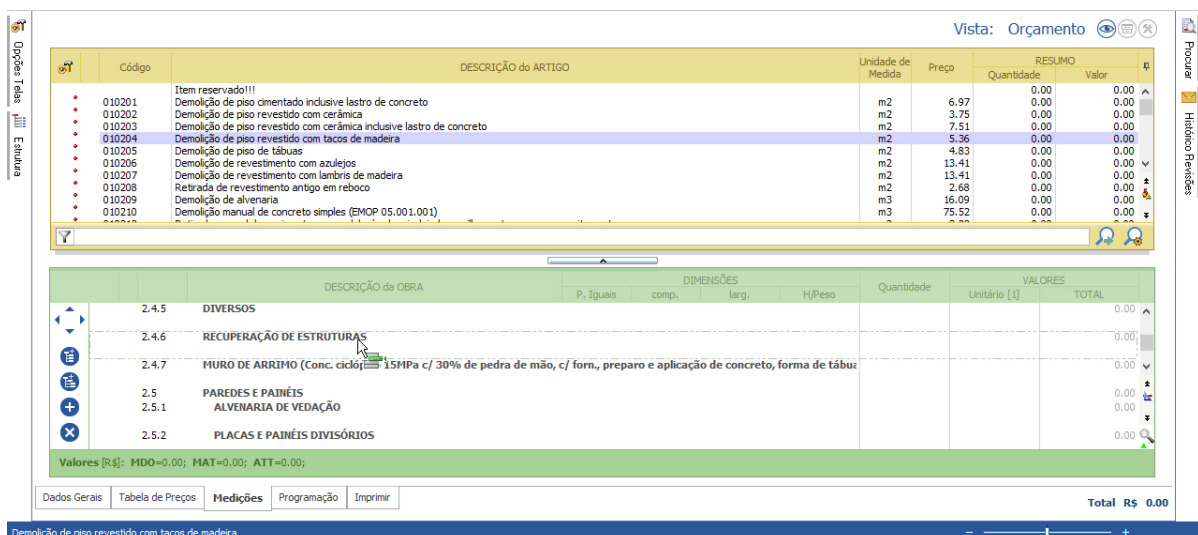

Código	DESCRIÇÃO do ARTIGO	Unidade de Medida	Preço	RESUMO	
				Quantidade	Valor
010201	Item reservado!!!			0.00	0.00
010202	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	6.97	0.00	0.00
010203	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	3.75	0.00	0.00
010204	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m2	7.51	0.00	0.00
010205	Demolição de piso revestido com tacos de madeira	m2	5.36	0.00	0.00
010206	Demolição de piso de tábuas	m2	4.83	0.00	0.00
010207	Demolição de revestimento com azulejos	m2	13.41	0.00	0.00
010208	Demolição de revestimento com lambris de madeira	m2	15.41	0.00	0.00
010209	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	2.68	0.00	0.00
010210	Demolição de alvenaria	m3	16.09	0.00	0.00
010210	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	75.52	0.00	0.00

DESCRIÇÃO da OBRA		DIMENSÕES			Quantidade	VALORES	
		P. Iguais	comp.	larg.	H/Peso	Unitário [1]	TOTAL
2.4.5	DIVERSOS						0.00
2.4.6	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS						0.00
2.4.7	MURO DE ARRIMO (Conc. cido 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ form., preparo e aplicação de concreto, forma de tábuas						0.00
2.5	PAREDES E PAINÉIS						0.00
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						0.00
2.5.2	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS						0.00


Valores [R\$]: MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 0.00


Demolição de piso revestido com tacos de madeira

Ao arrastar o item para o orçamento, na janela dos dados detalhados é possível, para além de escolher a estrutura, indicar diretamente a descrição e a quantidade total. De qualquer forma, é sempre possível indicar o detalhe das medições (partes iguais, comprimento, largura e altura/peso).

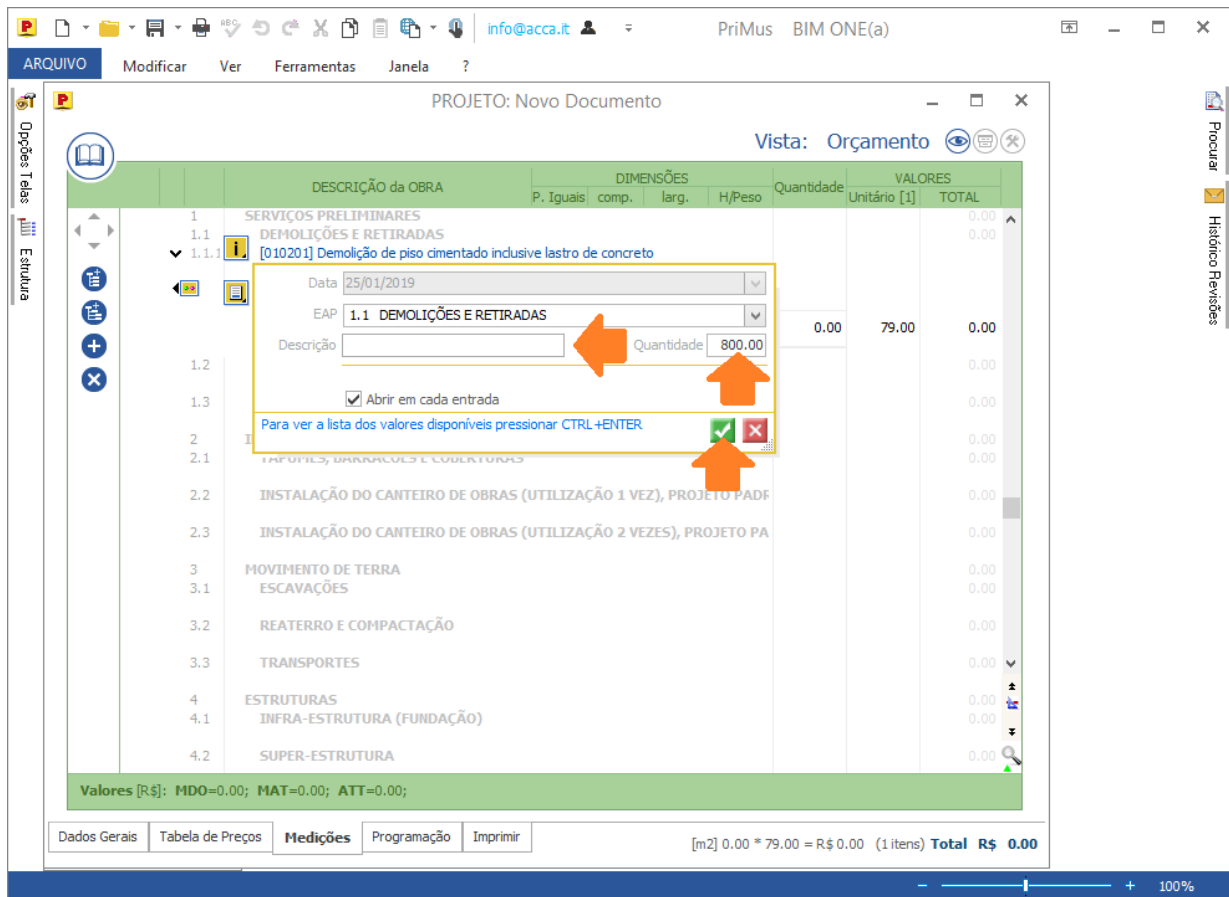

Para acelerar o procedimento ativando os filtros na EAP, é preciso:

- 1) ir para a estrutura EAP do orçamento;
- 2) ativar o filtro na EAP;

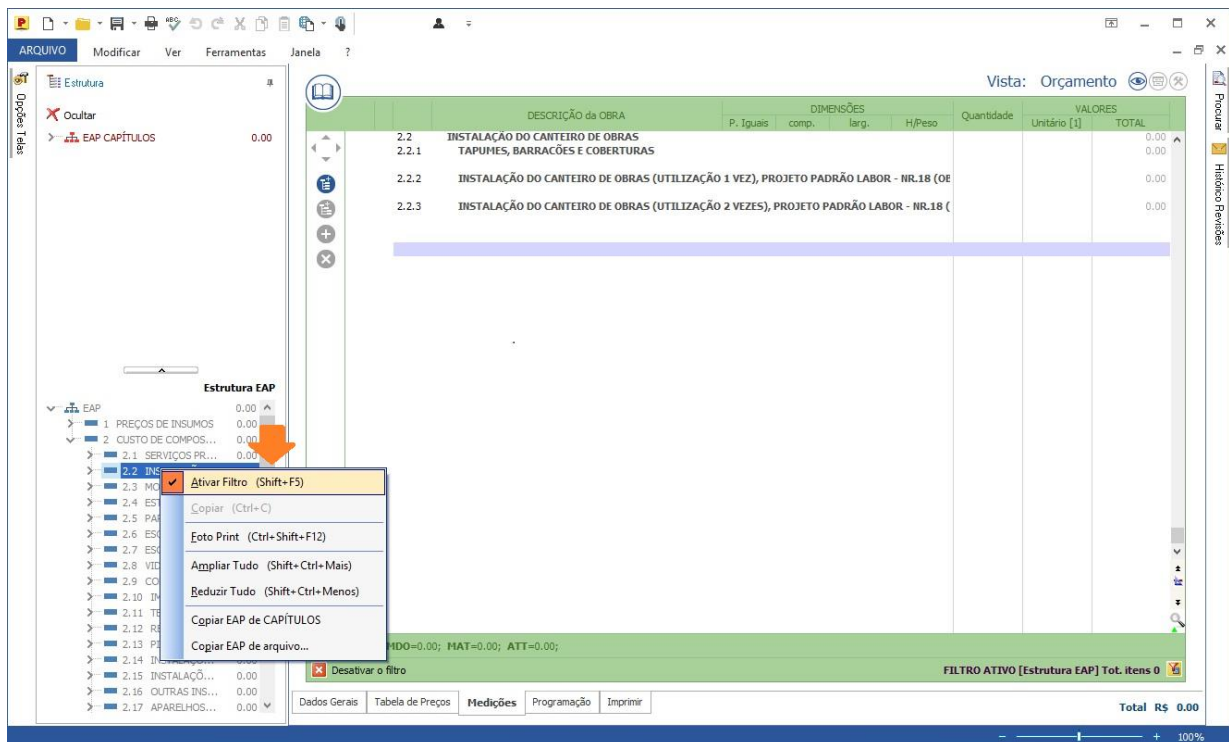

3) soltar o item (no editor Medições), de forma que possa ser associado à EAP anteriormente filtrada.

Vista: Orçamento

Código	DESCRIÇÃO do ARTIGO	Unidade de Medida	Preço	Quantidade	Valor
010401	Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m2	18.56	600.00	11 136.00
010501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	393.50	1 000.00	393 500.00
020305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPIES	m2	299.16	30.00	7 774.80
020701	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cir	m2	566.13	50.00	28 306.50
020801	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimen	m2	435.48	50.00	21 774.00
030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	42.53	143.00	6 081.79
040202	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto cúbico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão	m3	464.71	164.00	76 212.44
040315	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no cust	m3	618.54	0.00	0.00
170349	Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	59.69	0.00	0.00
170350	Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação	und	17.53	0.00	0.00
170353	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	374.61	0.00	0.00
1010101	AJUDANTE	H	5.42	0.00	0.00

DESCRIÇÃO da OBRA	DIMENSÕES	Quantidade	VALORES
	P. Iguala comp. larg. H/Peso		Unitário TOTAL
5.4 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS			0.00
5.5 INSTALAÇÕES APARENTES			0.00
5.6 COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA			0.00

Valores [R\$]: MDO=39 577.76; MAT=387 390.48; ATI=594.76;

Desativar o filtro

FILTRO ATIVO [Estrutura EAP] Tot. itens 0

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 584 295.53

EAP CAPÍTULOS 2 CUSTO DE COMPOSIÇÕES 2.17.3 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 2.17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

6) A vista das Necessidades

Uma vez elaborado o orçamento, é possível ter uma vista das necessidades que mostra, de acordo com os serviços orçamentados, as quantidades de recursos necessários.

Vista: Necessidades (Não Editável)

Código	DESCRIÇÃO de ITENS e dos ELEMENTOS	Unidade de Medida	Quantidade	Unitário	VALORES	TOTAL	Necessidades
73604	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	100.00	1 681.39	168 139.00	28.282	---
73864/001	NIVELAMENTO DE SOLO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO D/ÁREAS ENSAIABRADAS	HA	200.00	1 812.25	362 450.00	56.655	---
74022/024	ENSAIO TECNOLÓGICO ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS	UN	200.00	22.14	4 428.00	0.692	---
74022/045	ENSAIO TECNOLÓGICO ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMÁTICA - ASFALTO	UN	200.00	55.34	11 068.00	1.730	---
74228/001	BANCOS DE CONCRETO P/JARDIM BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPE	M	150.00	117.57	17 635.50	2.757	---
100000370	AREIA MÉDIA	M3	57.48	96.98	5 574.41	0.871	MAT
100001379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	KG	26 730.00	0.40	10 692.00	1.671	EQP
100004093	MOTORIZA DE CAMINHÃO	H	200.00	10.32	2 064.00	0.323	MDO
100004750	PEDREIRO	H	250.00	11.11	2 777.50	0.434	MDO
100006111	SERVENTE	H	800.00	9.31	7 448.00	1.164	MDO
100011683	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM	UN	150.00	13.98	2 097.00	0.328	MAT
100011696	LAVATÓRIO (OU CUBA) DE SOBREPOR	UN	150.00	58.26	8 739.00	1.366	MAT
100011760	SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4"	UN	150.00	72.64	10 806.00	1.689	VAR
100011769	APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ LAVATÓRIO REF 1875	UN	150.00	172.22	25 833.00	4.038	MAT
04884	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL	M3	55.00	388.84	21 386.20	3.343	COM.
05748	CAMINHÃO PIPA 6000L TÔCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRAN	H	200.00	10.32	2 064.00	0.323	COM.
73922/003	CIMENTADO LISO DESEMPENADO E=2,0CM CIMENTO/AREIA 1:3 PISO CIMENTADO LISO DESEM	M2	250.00	28.20	7 050.00	1.102	COM.
73947/001	APARELHOS DE LOUÇA - FORNECIMENTO E/OU COLOCAÇÃO LAVATÓRIO LOUÇA BR MÉDIO LUX	UN	150.00	316.50	47 475.00	7.421	COM.

Valores [R\$]: MDO=12 291.50; MAT=243.50; ATI=21 498.50;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 639 751.50

7) A impressão do orçamento

No editor **Imprimir** é possível visualizar os documentos que podem ser impressos.

ARQUIVO Modificar Ver Ferramentas Janela ?

Vista: Orçamento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	VALORES	
											Unitário [1]	TOTAL
1	PREÇOS DE INSUMOS											0.00
2	CUSTO DE COMPOSIÇÕES											639 751.50
2.1	[ASTU] ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS											550 031.00
2.1.1	[0045] FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELÁSTICA											168 139.00
2.1.1.1	[73604] CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	100.00					1 681.39					168 139.00
2.1.2	[0049] FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO CERÂMICO COM JUNTA ARGAMASSADA											19 442.00
2.1.2.1	[04884] ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL	50.00					388.84					19 442.00
2.1.3	[0053] FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS											362 450.00
2.1.3.1	[73864/001] NIVELAMENTO DE SOLO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO D/AREAS ENSAIBRADAS	200.00					1 812.25					362 450.00
2.2	[CANT] CANTEIRO DE OBRAS											6 492.00
2.2.1	[0001] CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO											4 428.00
2.2.1.1	[74022/024] ENSAIO TECNOLÓGICO ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS	200.00					22.14					4 428.00
2.2.2	[0004] MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											2 064.00
2.2.2.1	[05748] CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E MOTOBOMBA CENTR	200.00					10.32					2 064.00
2.3	[COBE] COBERTURA											35 753.50
2.3.1	[0074] TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA											11 068.00
2.3.1.1	[74022/045] ENSAIO TECNOLÓGICO ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO	200.00					55.34					11 068.00
2.3.2	[0079] CUMEITEIRA CERÂMICA											17 635.50
2.3.2.1	[74228/001] BANCOS DE CONCRETO P/JARDIM BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOI-OS DO ME	150.00					117.57					17 635.50
2.3.3	[0087] RUFO/ESPIGÃO/RINÇÃO DIVERSOS											7 050.00
2.3.3.1	[73922/003] CIMENTADO LISO DESEMPENADO E=2,0CM CIMENTO/AREIA 1:3 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E A	250.00					28.20					7 050.00
2.4	[DROP] DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POCOS DE VISITA E CAIXAS											47 475.00
2.4.1	[0030] ENSECADEIRAS											47 475.00
2.4.1.1	[73947/001] APARELHOS DE LOUÇA - FORNECIMENTO E/OU COLOCAÇÃO LAVATÓRIO LOUÇA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO (	150.00					316.50					47 475.00
TOTAL R\$												639 751.50

Valores [R\$]: MDO=12 291.50; MAT=42 243.50; ATT=21 496.50

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

[UN] 200.00 * 22.14 = R\$ 4 428.00 (9 itens) Total R\$ 639 751.50

ARQUIVO Modificar Ver Ferramentas Janela ?

Colocar ao lado horizontalmente Em Cascata
Colocar ao lado verticalmente Minimizar
Organizar

Dividir janela Fechar tudo Mudar janela

Tabela de Preços (padrão)

Imprimir

Lista IMPRESSÕES

IMPRESSÃO PADRÃO

Configurações

Gerais
Código desde a - Imprimir TODOS os Iten...

EAP CAPÍTULOS
Todos os Itens

Instalações
Configuração Padrão

Notas
Configuração Padrão

Outro & Assinaturas
Colunas: Núm.Ord. Código - Unid. de Medi...

Lugar Data
23/01/2019


Arquivamento DEFINITIVO no "HISTÓRICO"

Exportar...


80%

8) O recurso do Gantt (Editor Programação)


No editor **Programação** do documento de **Projeto** é possível realizar um plano dos serviços.

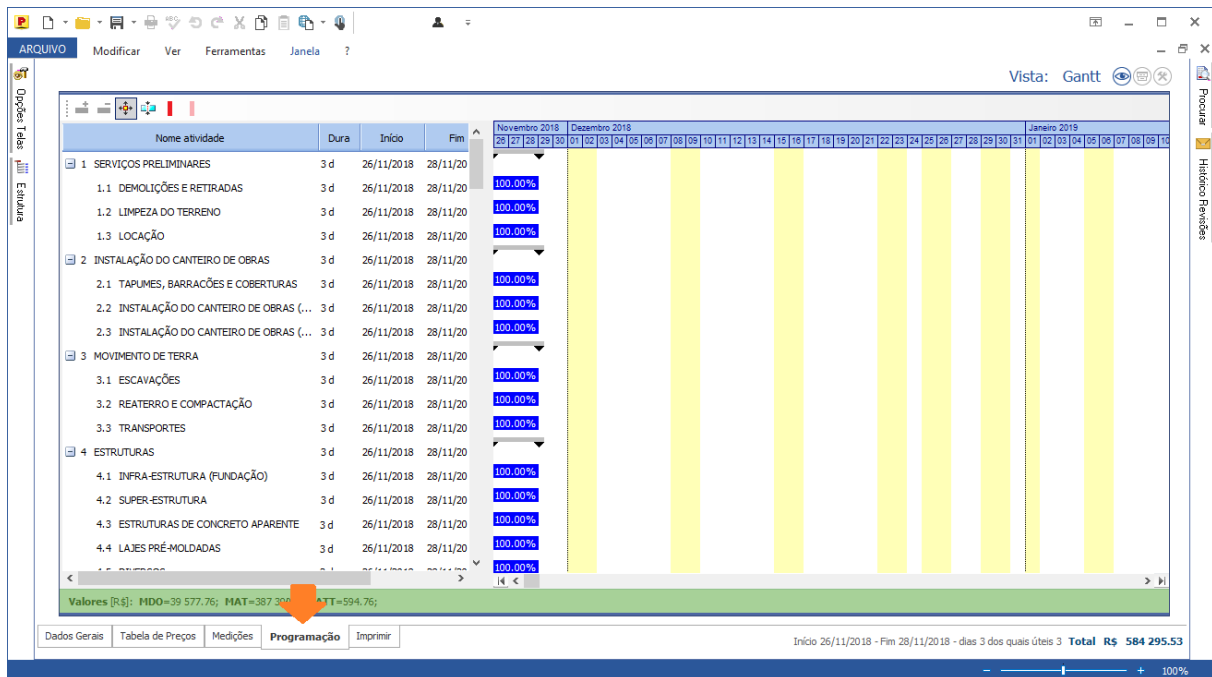


Grças a funções específicas, é possível definir o intervalo de início, fim e duração de cada serviço.

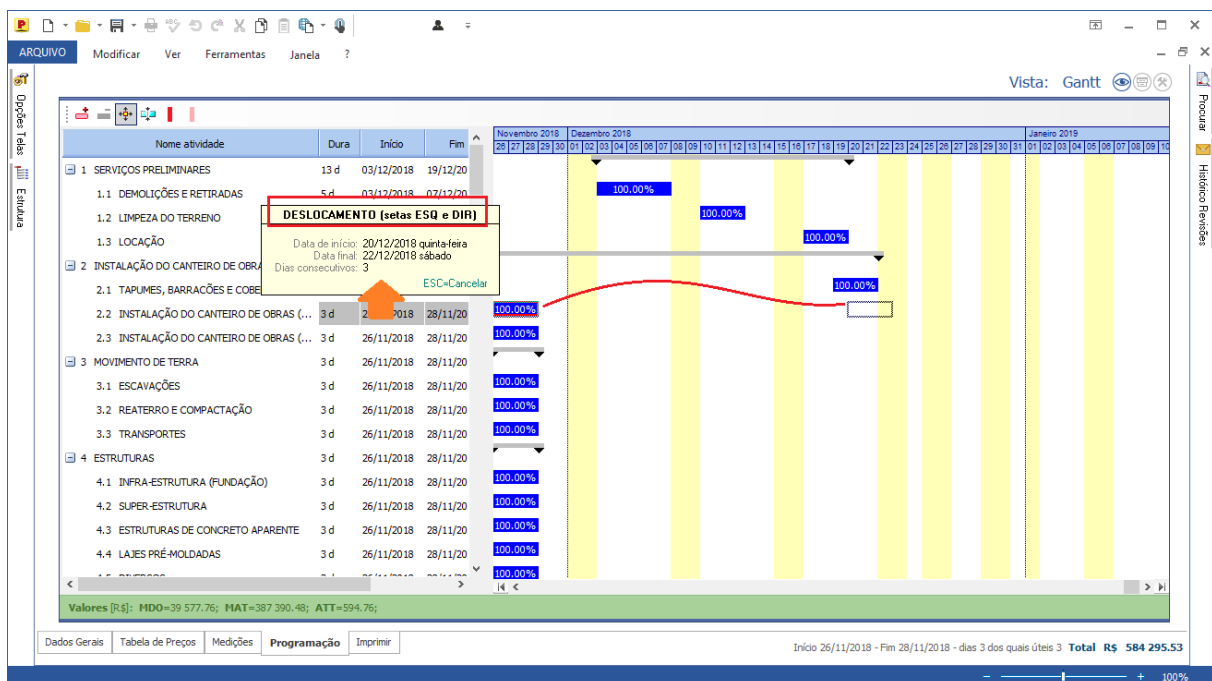

Para além disso, para planejar a mesma atividade em períodos diferentes e não necessariamente seguintes, é possível dividir os períodos em vários intervalos.

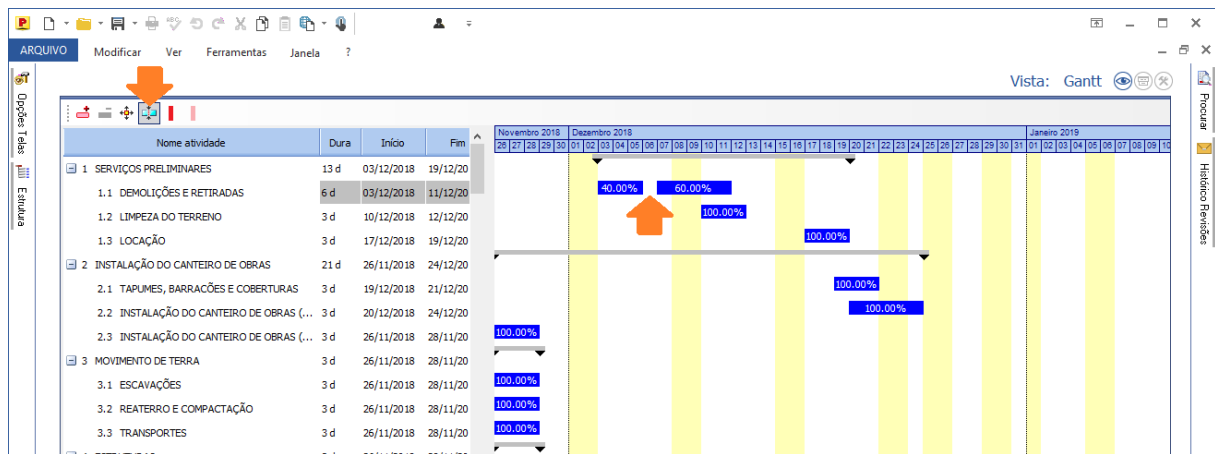


É possível modificar a porcentagem de cada período da atividade, para depois recalcular de forma dinâmica a porcentagem do período restante.

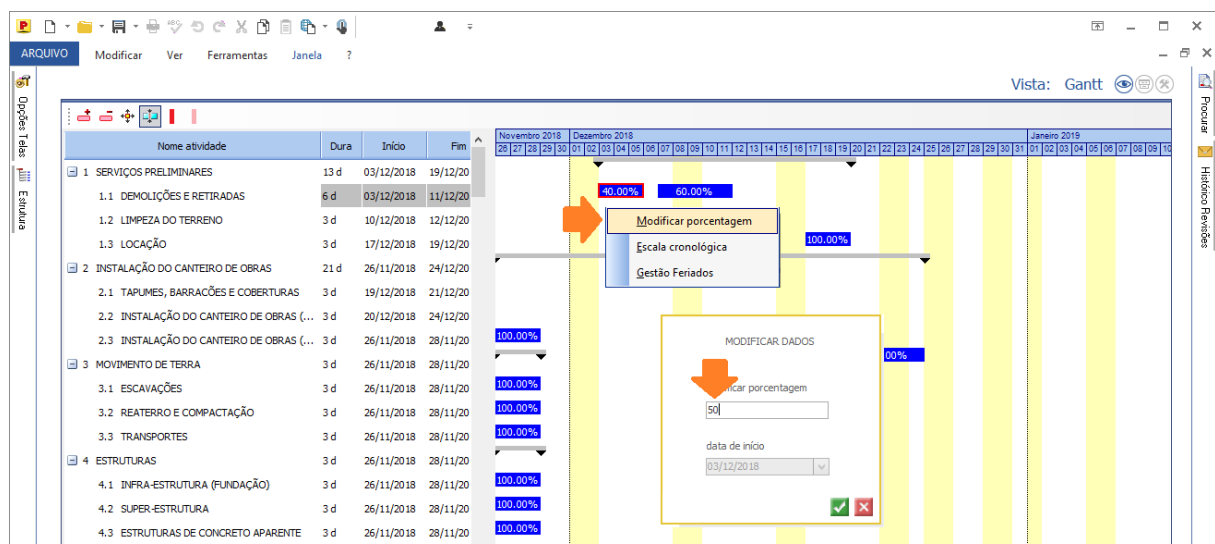

Programação: a vista Necessidades

É possível consultar o cronograma definindo um intervalo de datas.

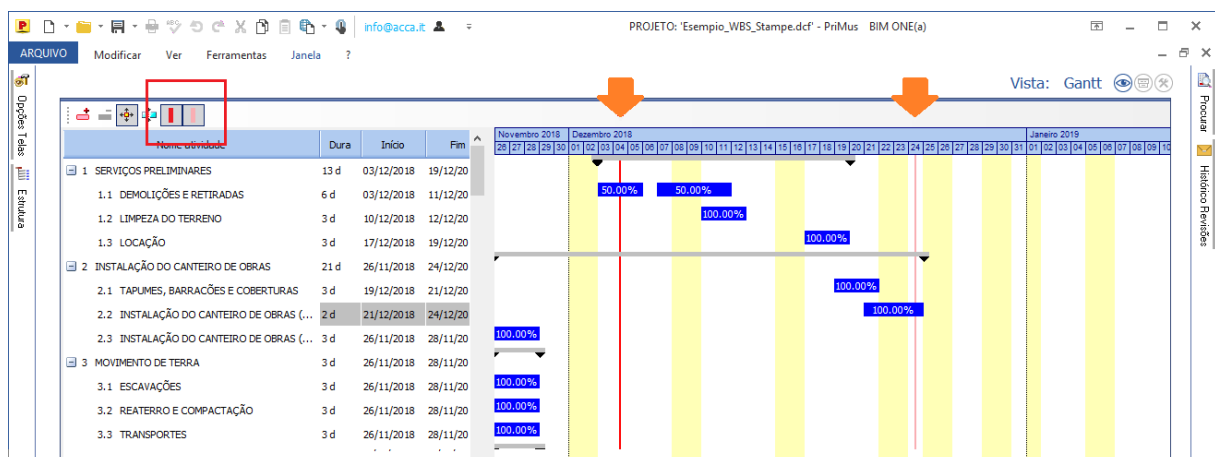

Para obter as necessidades de todos os recursos necessários no período definido, é preciso acessar a vista **Necessidades**.

Vista: Necessidades de 04/12/2018 a 24/12/2018 (Não Editável)

	Código	DESCRIÇÃO de ITENS e dos ELEMENTOS	Unidade de Medida	Quantidade	Unitário	VALORES TOTAL	
✓		INSUMOS					
>	1010101	AJUDANTE	H	700.00	5.42	3 794.00	0.649
>	1010111	CARPINTEIRO	H	226.52	6.42	1 454.26	0.249
>	1010115	ELETRICISTA	H	56.22	6.42	360.93	0.062
>	1010118	ENCANADOR	H	765.47	6.42	4 914.32	0.841
>	1010121	ARMADOR	H	0.48	6.42	3.08	0.001
>	1010139	PEDREIRO	H	324.90	6.42	2 085.86	0.357
>	1010140	PINTOR	H	93.28	6.42	598.86	0.102
>	1010146	SERVENTE	H	1 210.47	4.72	5 713.42	0.978
>	1010150	TELHADISTA	H	15.89	6.42	102.01	0.017
>	1020503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	2.41	58.75	141.59	0.024
>	1020505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	KG	84.75	0.66	55.94	0.010
>	1020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	426.77	0.36	153.64	0.026
>	1020517	BRITA 1	M3	0.07	70.02	4.90	0.001
>	1020518	BRITA 2	M3	0.16	70.02	11.20	0.002
>	1020519	BRITA 3	M3	3.00	70.02	210.06	0.036
>	1021009	PONTELETE DE MADEIRA BRUTA DE 3" 8.0 X 8.0 CM	M	414.50	3.52	1 459.04	0.250
>	1021016	SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM	M	7.75	11.19	86.72	0.015
>	1021021	TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)	M2	90.00	130.89	11 780.10	2.016
>	1021032	CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM	M2	150.00	18.81	2 821.50	0.483
>	1021103	TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM	M	0.49	40.27	19.73	0.003
>	1021517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	6.90	3.99	27.53	0.005
>	1022502	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	UN	128.67	1.37	176.28	0.030
>	1022586	BLOCO CERÂMICO 10 Furos 09X19X19CM - DA FABRICA	UN	13.75	0.39	5.36	0.001
>	1024015	SIKA 1	KG	4.20	5.58	23.44	0.004
>	1025513	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM	M2	78.78	20.04	1 578.75	0.270
>	1026503	CONJUNTO VEDACAO ELASTICA	UN	97.27	0.57	55.44	0.009
>	1026517	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	97.27	0.88	85.60	0.015
>	1026548	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM	UN	41.00	0.21	8.61	0.001
>	1026549	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	14.00	0.07	0.98	0.000
>	1026550	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	614.00	8.51	5 225.14	0.894
>	1026560	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	KG	25.85	7.24	187.15	0.032
>	1026569	PREGO 18X27	KG	3.82	6.85	26.17	0.004
>	1027005	ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG	KG	20.00	9.00	180.00	0.031
>	1027010	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0.12	6.82	0.82	0.000
>	1028008	RESMOLA PLANTAS PARA FORMAS	L	0.20	13.26	2.65	0.000

Programação: a vista Plano Financeiro

No editor Programação é possível definir o **Plano Financeiro**.

A vista mostra três tipos de cálculo:

- 1) **automático**: realiza de forma automática o cálculo de acordo com a programação dos serviços no GANTT;
- 2) **personalizado**: ao modificar um valor, recalcula os restantes de forma proporcional, a fim de atingir o valor total do orçamento;
- 3) **distribuído**: aloca o mesmo valor ao longo dos vários períodos, exceto o último, onde é indicada a diferença em relação ao total do orçamento.

Vista: Plano financeiro

OPÇÕES

☒ Cálculo automático

☐ Valor personalizado

☐ Valor distribuído

292 147.77

N.º	Período	Valor
1	Novembro 2018	104 068.23
2	Dezembro 2018	480 227.30

Valores (R\$): MDO=39 577.76; MAT=387 395.77; TT=594.76;


Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Início 26/11/2018 - Fim 24/12/2018 - dias 29 dos quais úteis 21 Total R\$ 584 295.53

Alterar a visualização ativa ...

9) Criação do documento de Planejamento

Para criar um documento do tipo **Planejamento** é possível selecionar a relacionada opção diretamente a partir da **Home** do programa.

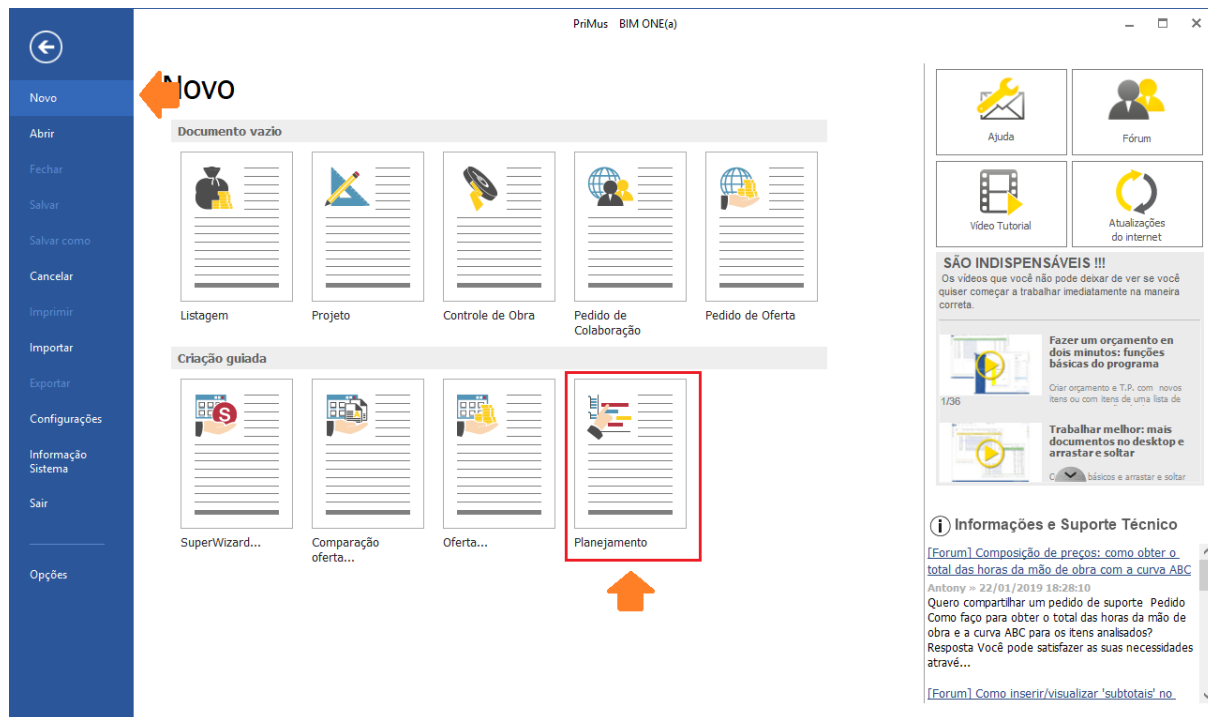

O documento **Planejamento** deve ser criado necessariamente a partir de um documento de referência, que inclui o orçamento.

Esse documento, de facto, permite elaborar um orçamento detalhado e obter em tempo real a diferença entre a quantidade **Planejada** e a quantidade de **projeto** definida no documento de referência.

The screenshot shows the 'Vista: Orçamento' (View: Budget) window in the PriMus BIM ONE(a) software. The window displays a table of project items with columns for 'Código', 'DESCRIÇÃO do ARTIGO', 'Unidade de Medida', 'Preço', 'RESUMO', and 'COMPARAÇÃO QUANTIDADE'. The 'COMPARAÇÃO QUANTIDADE' section is highlighted with a red box and an orange arrow pointing to it. Below the table, there is a section for 'DESCRIÇÃO da OBRA' (Description of the Work) with columns for 'P. Iguais', 'comp.', 'larg.', 'H/Peso', 'Quantidade', 'Unitário [1]', and 'VALORES TOTAL'. The table shows various items with their respective quantities and prices, and a summary of the total values.

Código	DESCRIÇÃO do ARTIGO	Unidade de Medida	Preço	RESUMO	COMPARAÇÃO QUANTIDADE
				Quantidade	Valor
010201	Item reservado!!!			0.00	0.00
010401	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	79.02	50.00	3 951.00
010501	Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m2	18.56	650.00	12 064.00
020305	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	393.50	0.00	0.00
020701	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	299.16	0.00	0.00
020801	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete B	m2	566.13	0.00	0.00
030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	42.53	0.00	0.00
040202	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão	m3	464.71	0.00	0.00
040315	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas)	m3	618.54	0.00	0.00
170349	Canisla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	59.69	0.00	0.00
170350	Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação	und	17.53	0.00	0.00
170353	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	374.61	0.00	0.00

DESCRIÇÃO da OBRA	P. Iguais	comp.	larg.	H/Peso	Quantidade	Unitário [1]	VALORES TOTAL
1.1 [010201] Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto					50.00		3 951.00
1.2 [010401] Corte de capoeira fina, a foice (manual)					650.00	18.56	12 064.00
Valores [R\$]: MDO=2 318.50; MAT=7 838.00; ATT=0.00;							

[m2] 650.00 * 18.56 = R\$ 12 064.00 (2 itens) **Total R\$ 16 015.00**

10) Impressão relatório do documento de Planejamento

Enfim, é possível visualizar e imprimir o relatório que contém a quantidade de Projeto (orçamento), a quantidade Planejada e a diferença.

The screenshot shows the 'Vista: Orçamento' window. A red box highlights the 'Comparação quantidade' menu, which includes options like 'Mostrar "Comparação Quantidade"', 'Imprimir "Comparação Quantidade"', and 'Imprimir "Comparação Quantidade" somente dos itens utilizados'.

ARTIGO	Unidade de Medida	Preço	RESUMO		COMPARAÇÃO QUANTIDADE		
			Quantidade	Valor	de Projeto	Planejada	Diferença
concreto	m2	79.02	0.00	0.00	---	---	---
	m2	18.56	50.00	3 951.00	500.00	50.00	-450.00
	m2	650.00	650.00	12 064.00	600.00	650.00	50.00
50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8	m2	393.50	0.00	0.00	1 000.00	0.00	-1 000.00
50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8	m2	259.16	0.00	0.00	30.00	0.00	-30.00
até 1.50 m de profundidade	m2	566.13	0.00	0.00	50.00	0.00	-50.00
álculo Fck=15MPa com 30% de pedra de mão	m3	435.48	0.00	0.00	50.00	0.00	-50.00
k = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas j	m3	42.53	0.00	0.00	143.00	0.00	-143.00
erência Fabrimar, Deca ou Docol	m3	464.71	0.00	0.00	164.00	0.00	-164.00
ave colocação	und	618.54	0.00	0.00	---	---	---
cas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	59.69	0.00	0.00	---	---	---
	und	17.53	0.00	0.00	---	---	---
	und	374.61	0.00	0.00	---	---	---

The screenshot shows the 'Vista atual: Comparação Quantidade' window. A red box highlights the 'Lista IMPRESSÕES' section, which includes options like 'Vista Atual', 'Arquivamento DEFINITIVO no "HISTÓRICO"', and 'Imprimir'.

Nº Ordem CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	Unidade do Medida	COMPARAÇÃO QUANTIDADE			%
			de Projeto	Planejada	Diferença	
1	[010201] Desobrigação de piso cimentado inclusive laje de concreto	m2	500.00	50.00	-450.00	10.00
2	[010401] Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m2	600.00	650.00	50.00	108.33

Fichas de aprofundamento

ETAPA	NOTAS
-------	-------

NOTAS

The image displays three sequential screenshots of the BIM ONE(a) software interface, illustrating the process of opening a document from the cloud. The first screenshot shows the 'Arquivo' menu with 'Abrir Listagem da Web...' highlighted. The second screenshot shows the 'Abrir Documento web' dialog box with the file list expanded to 'BRASIL' and 'SINAPI - CADA' selected. The third screenshot shows the same dialog box with 'ACRE' selected and the 'Abrir' button highlighted.

São abertas diretamente a partir do software PriMus...

Arquivo Modificar Ver Ferramentas Janela ?

Projeto: Novo Documento

	DESCRIÇÃO DA OBRA	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.3	LOCAÇÃO			
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			
2.2	TAPUBES, BARRACAS E COBERTURAS			
2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PR			
2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),			
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ESCAVAÇÕES			
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO			
3.3	TRANSPORTES			
4	ESTRUTURAS			
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)			
4.1	SUPER-ESTRUTURA			
4.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE			
4.3	LAPIS PRÉ-MOLDADAS			

Valores [R\$]: HMO=0,00; MAT=0,00; ATT=0,00;

Dados Gerais Tabela de Precos Medições Programação Imprimir

Total R\$ 0,00

LISTAGEM SINAPI - RIO BRANCO (11-2018) com desoneração

Vista: listagem de Precos


Código	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	Unidade	Preço [R\$]	R.
05089	Item reservado!!!			
05089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO HÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA	H	18,29	
05089	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERA	H	22,71	
05089	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERA	H	28,38	
05089	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERA	H	69,48	
05089	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERA	OP	109,96	
05089	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERA	OP	53,10	
05089	GRUPE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCALCO, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM	H	1,07	
05089	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTE	H	17,05	
05089	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X2, POTE	H	15,17	
05089	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X2, POTE	H	53,17	
05089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO HÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80	H	109,14	
05089	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTE	OP	116,30	
05089	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTE	OP	41,70	
05089	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X2, POTE	OP	39,80	
05089	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X2, POTE	OP	108,14	
05089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO HÉ DE CARNEIRO ADO LISO, POTÊNCIA 80 H	OP	36,29	
05089	GRUPE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCALCO, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM	OP	3,03	
05089	GRUPE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCALCO, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM	H	1,96	
05089	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS	H	0,18	
05089	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS	H	4,20	
05089	CAMINHÃO BASCULANTE 6x4, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 10	H	21,16	
05089	MAQUINA DE CONCRETO DUTO, CAPACIDADE NOMINAL DE 0 A 120 M3/M3, SEM SUI	H	13,09	
05089	CAMINHÃO TÔCO, PTE 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.000 KG, EMBRE E	H	10,87	
05089	UNID. MTR DE MODA DE PISO DE CARAMELADA DE 300 X 600 (TODOS)	H	99,45	

Dados Gerais Tabela de Precos Imprimir (11796 itens)

Total R\$ 0,00


Da Lista de Preços é possível pesquisar o serviço desejado...

3

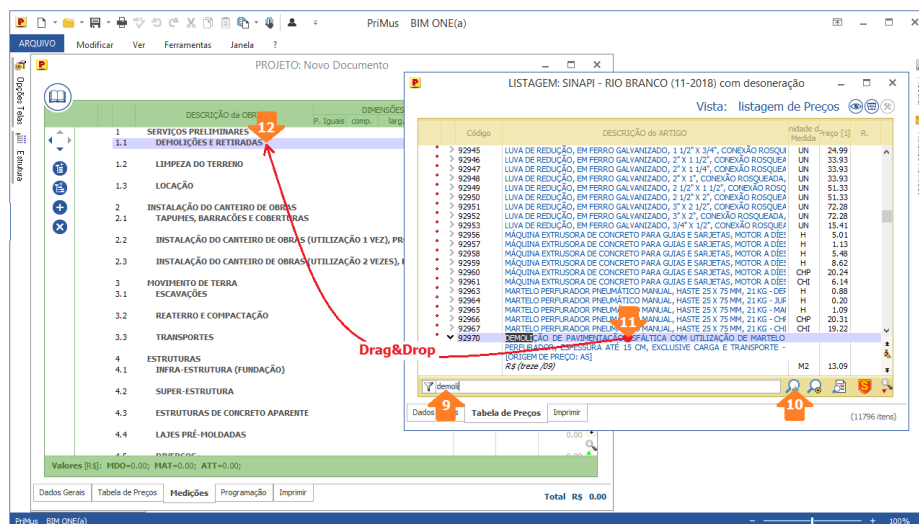

...o serviço é arrastado da Lista de Preços e soltado diretamente no orçamento.

4

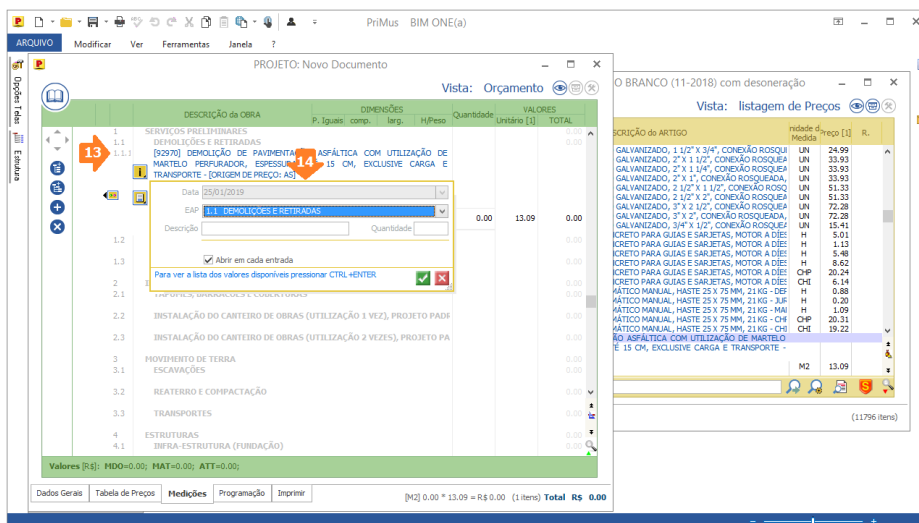

No dialog que irá aparecer é possível indicar diretamente a quantidade total.

Cancelando (clique na X), é possível inserir os detalhes das medidas (descrição, parte iguais, comprimento, largura e altura/peso).

[illegible]

Se pretender indicar a quantidade total, é suficiente confirmar o dialog...

6

...para obter a quantidade já inserida no orçamento.

7

Projeto: Novo Documento.dcf - PriMus BIM ONE(a)

Vista: listagem de Preços

2

1

3

4

Item

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Unidade de Medida

Preço [1]

Quantidade

2.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1.1.1

[01020] Demolição de piso orientado inclusive lastro de concreto

m2

79,02

2

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1.4

LOCACÃO

2.1.4.1

[01040] Corte de capoeira fina, a force (manual)

m2

1,03

600,00

2.2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1

TAPUMES, BARRACOS E COBERTURAS

2.2.1.1

[02030] Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPIES

m2

259,16

30,00

7.774,80

2.2.2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NRL18 (OE [02070] Barracão para escritório com sanitário área de 14,50 m2, de chapa de compens. 12mm e ponteale 8x

m2

566,13

50,00

28.306,50

2.2.3

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NRL18 ([02080] Barracão para escritório com sanitário área 14,50m2, de chapa de compens. 12mm e ponteale 8x

m2

435,48

50,00

21.774,00

2.3

MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1

ESCAVAÇÕES

2.3.1.1

[03010] Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade

m3

42,53

143,00

6.081,79

2.3.2

REATERRO E COMPACTAÇÃO

2.3.3

TRANSPORTES

2.4

ESTRUTURAS

2.4.1

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

2.4.1.1

[04020] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto cúbico Fck=18MPa com 30% de pedra de mão

m3

464,71

164,00

76.212,44

2.4.2

SUPER-ESTRUTURA

2.4.2.1

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3

ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE

2.4.3.1

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.2

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.3

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.4

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.5

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.6

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.7

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.8

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.9

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.10

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.11

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.12

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.13

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.14

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.15

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.16

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.17

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.18

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.19

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.20

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.21

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.22

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.23

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.24

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.25

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3.26

[04015] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - [5% de perdas já inc

m3

618,54

0,00

0,00

2.4.3

Na vista Composições de Preços é possível visualizar os elementos que compõem o serviço.

Nesta vista é, ainda, possível modificar a composição dos serviços e/ou criar novas composições...

8

Projeto: Novo Documento.dcf - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Composição de Preços



Item	DESCRIÇÃO DE ITENS E DOS ELEMENTOS	Unidade de Medida	Quantidade	Unidade	VALORES	TOTAL	%	R.
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1.1.1	Demolição de piso antiderrapante inclusive lastro de concreto							
1	DEMOLEÇÃO	m2	0.13000000		6.42	0.83	1.529	MOD
2	DEMOLEÇÃO	m2	1.30000000		6.14	11.312	MOD	
3	DEMOLEÇÃO	m2	1.00000000		47.31	87.159	COM.	
	Encargos Sociais 126.63% (Preço de MOD: 8.15) R\$					54.28		
						10.32		
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 22.32% * (64.60) R\$					64.60		
						14.42		
	TOTAL R\$ / m2					79.02		
2.1.2	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS							
2.1.3	LIMPEZA DO TERRENO							
2.1.3.1	Corte de capoeira fina, a força (manual)	m2			1.03			
2.1.4	LOCAÇÃO							
2.1.4.1	Locação de obra com gabarito de madeira	m2			18.90			
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
2.2.1	TANQUES, BARRACÕES E COBERTURAS							
2.2.1.1	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão LOPES	m2			259.16			
2.2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PAI	m2			566.13			
2.2.2.1	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de zinco	m2			435.48			
2.2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO P	m2			435.48			
2.2.3.1	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de zinco	m2			435.48			
2.3	MOVIMENTO DE TERRA							
2.3.1	CAVACÕES							
2.3.1.1	Cavacão manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3			42.53			
2.3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO							
2.3.3	TRANSPORTES							
2.4	ESTRUTURAS							
2.4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)							
2.4.1.1	Fundação para concreto armado, preparo e aplicação de concreto adóscico Fck=19MPa com	m3			464.71			
2.4.2	Formas e ferragens							

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

(96 item) Total R\$ 179.343,51

Editor de Dados

Como criar a EAP do orçamento e/ou a tabela de preços

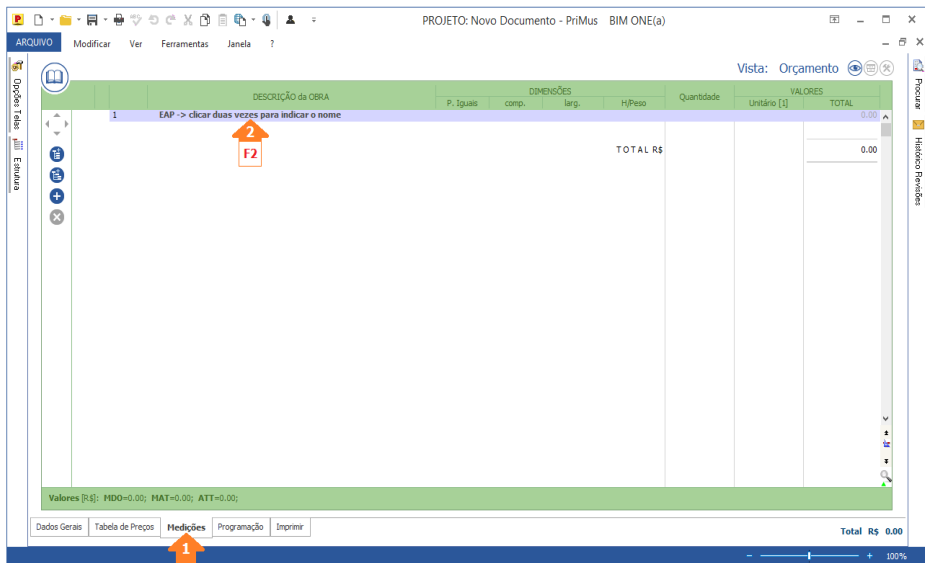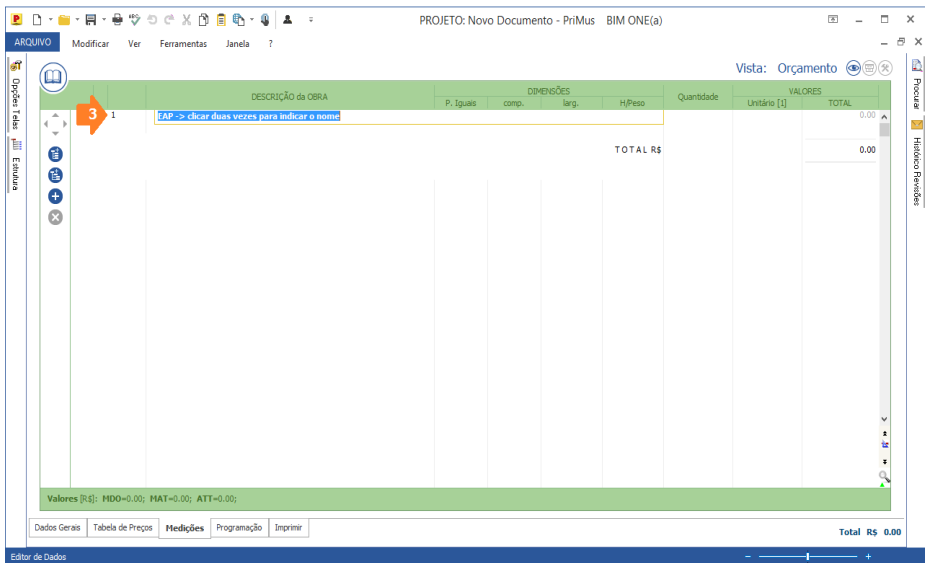STEP		NOTAS
1		A estrutura da EAP pode ser criada diretamente a partir do editor Medições do documento... <u>Nota</u> – o mesmo procedimento pode ser realizado para criar a EAP no editor Tabela de Preços.
2		...o primeiro nó sugerido por default no editor pode ser renomeado usando o nome desejado...

PROJETO: Novo Documento - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

6

DESCRIÇÃO da OBRA	DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
	P. Iguais	comp.	larg.	H/Peso		Unitário [1]	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							0.00
TOTAL R\$							0.00

Valores (R\$:) MD0=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;


Dados Gerais | Tabela de Preços | **Medições** | Programação | Imprimir

Total R\$ 0.00

100%

Como criar um nó filho

5

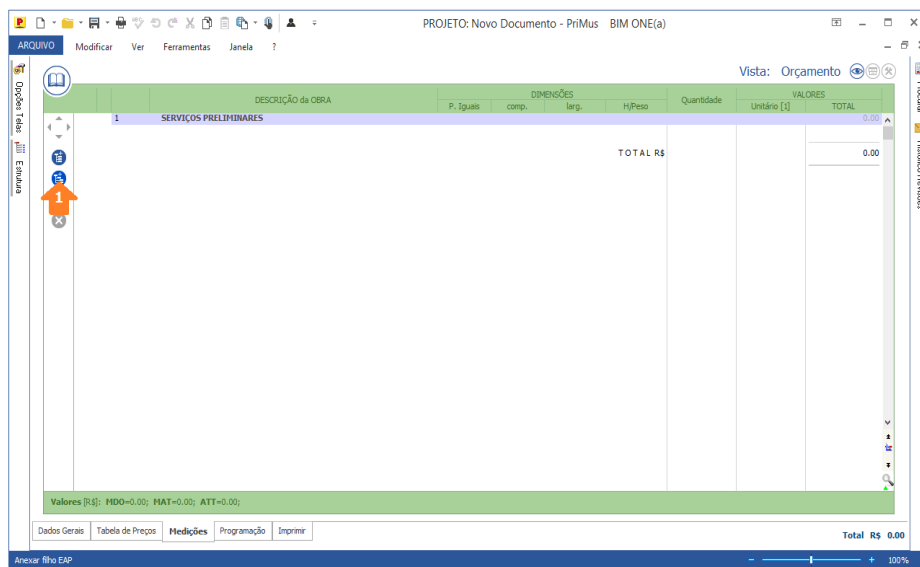


NOTAS

Criação dos restantes nó da EAP...

Recurso utilizado


- O botão  permite criar um nó filho do nó selecionado.

6

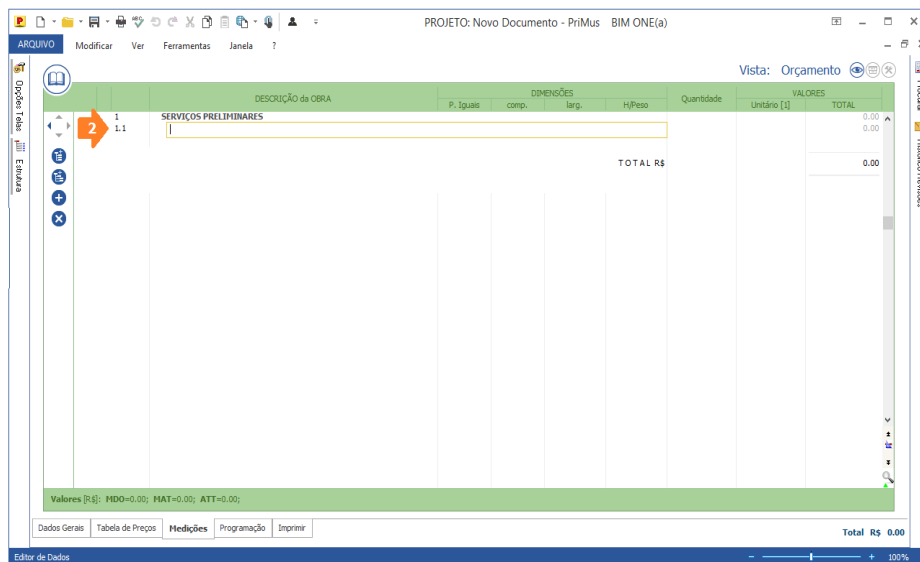

...o nó filho assim criado apresenta, de forma automática, a numeração de acordo com a sua posição...

7

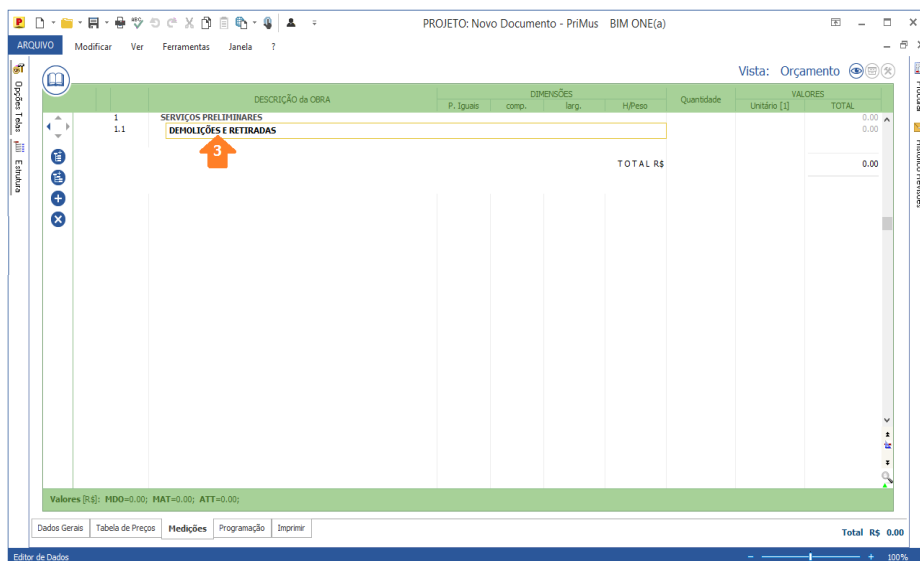

The screenshot shows a software window titled 'PROJETO: Novo Documento - PriMus BIM ONE(a)'. The 'Vista: Orçamento' (View: Budget) is selected. The table has columns for 'DESCRIÇÃO da OBRA' (Description of the Work), 'DIMENSÕES' (Dimensions), 'Quantidade' (Quantity), and 'VALORES' (Values). The 'DESCRIÇÃO da OBRA' column contains 'SERVIÇOS PRELIMINARES' and 'DEMOLIÇÕES E RETIRADAS'. The 'DIMENSÕES' column has sub-columns for 'P. Igual', 'comp.', 'larg.', and 'H/Peso'. The 'VALORES' column has sub-columns for 'Unitário [1]' and 'TOTAL'. The 'TOTAL' column shows '0.00'. An orange arrow points to the row containing 'DEMOLIÇÕES E RETIRADAS'. The status bar at the bottom shows 'Total R\$ 0.00'.

	DESCRIÇÃO da OBRA	DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Igual	comp.	larg.	H/Peso		Unitário [1]	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0.00	0.00
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0.00	0.00
	TOTAL R\$							0.00

Valores (R\$): MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir


Total R\$ 0.00

...indicar o nome e proceder da mesma forma para criar os restantes nós da EAP.

Como criar um nó no mesmo nível do nó selecionado

NOTAS

8

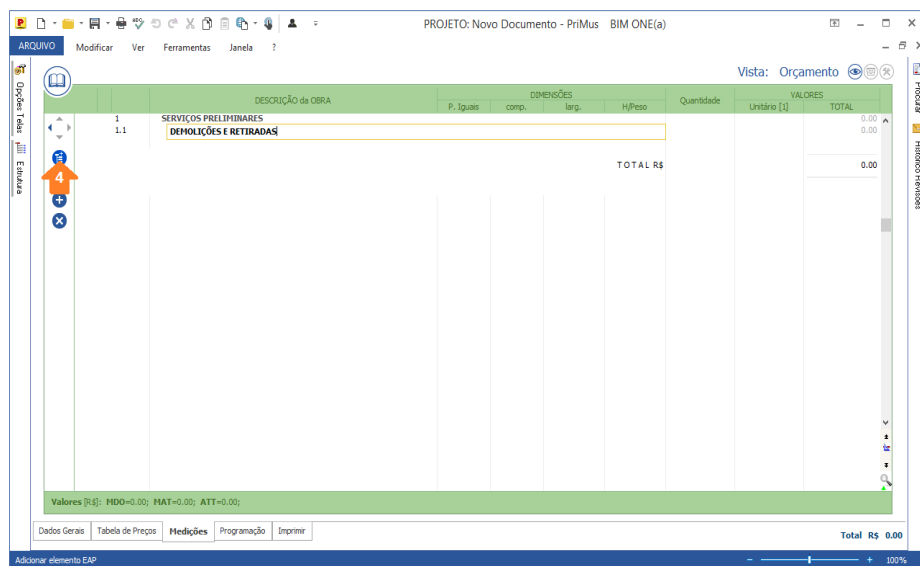

The screenshot shows the same software window as in step 7. The 'DESCRIÇÃO da OBRA' column contains 'SERVIÇOS PRELIMINARES' and 'DEMOLIÇÕES E RETIRADAS'. The 'DIMENSÕES' column has sub-columns for 'P. Igual', 'comp.', 'larg.', and 'H/Peso'. The 'VALORES' column has sub-columns for 'Unitário [1]' and 'TOTAL'. The 'TOTAL' column shows '0.00'. An orange arrow points to the row containing 'DEMOLIÇÕES E RETIRADAS'. The status bar at the bottom shows 'Total R\$ 0.00'.

	DESCRIÇÃO da OBRA	DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Igual	comp.	larg.	H/Peso		Unitário [1]	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0.00	0.00
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0.00	0.00
	TOTAL R\$							0.00

Valores (R\$): MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 0.00

Criar os nós no mesmo nível do nó criado anteriormente...

Recurso utilizado

O botão  permite criar um nó no mesmo nível do nó selecionado.

9

PROJETO: Novo Documento - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO da OBRA		DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Igual	comp.	larg.	H/Peso		Unitário [1]	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							0.00
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							0.00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO							0.00
1.3	LOCAÇÃO							0.00
TOTAL R\$								0.00

Valores [R\$]: MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 0.00

Editor de Dados

Como criar um nó e, em seguida, deslocá-lo de nível

NOTAS

10

PROJETO: Novo Documento - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO da OBRA		DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Igual	comp.	larg.	H/Peso		Unitário [1]	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							0.00
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							0.00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO							0.00
1.3	LOCAÇÃO							0.00
TOTAL R\$								0.00

Valores [R\$]: MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 0.00

Editor de Dados

11

PROJETO: Novo Documento - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

	DESCRIÇÃO da OBRA	DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Iguais	comp.	larg.	H/Peso		Unitário [1]	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							0.00
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							0.00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO							0.00
1.3	LOCAÇÃO							0.00
1.4								0.00
TOTAL R\$								0.00

Valores (R\$): MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais | Tabela de Preços | **Medições** | Programação | Imprimir

Total R\$ 0.00

Editor de Dados



12

PROJETO: Novo Documento - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

	DESCRIÇÃO da OBRA	DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Iguais	comp.	larg.	H/Peso		Unitário [1]	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							0.00
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							0.00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO							0.00
1.3	LOCAÇÃO							0.00
1.4	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							0.00
TOTAL R\$								0.00

Valores (R\$): MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais | Tabela de Preços | **Medições** | Programação | Imprimir

Total R\$ 0.00

Editor de Dados

Dependendo do nó selecionado, ativam-se as setas que permitem deslocá-lo nas posições possíveis...

Recurso utilizado

A seleção das setas ativas  permite deslocar para uma posição diferente o nó selecionado.

PROJETO: Novo Documento - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

	DESCRIÇÃO DA OBRA	DIMENSÕES				Quantidade	VALORES	
		P. Igual	comp.	larg.	H/Peso		Unitário (1)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							0.00
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							0.00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO							0.00
1.3	LOCAÇÃO							0.00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							0.00
TOTAL R\$								0.00

Valores (R\$): MDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Total R\$ 0.00


O deslocamento também define a renumeração do nó de acordo com a nova posição.

Como adquirir a EAP do orçamento a partir de outro documento

STEP

NOTAS


1

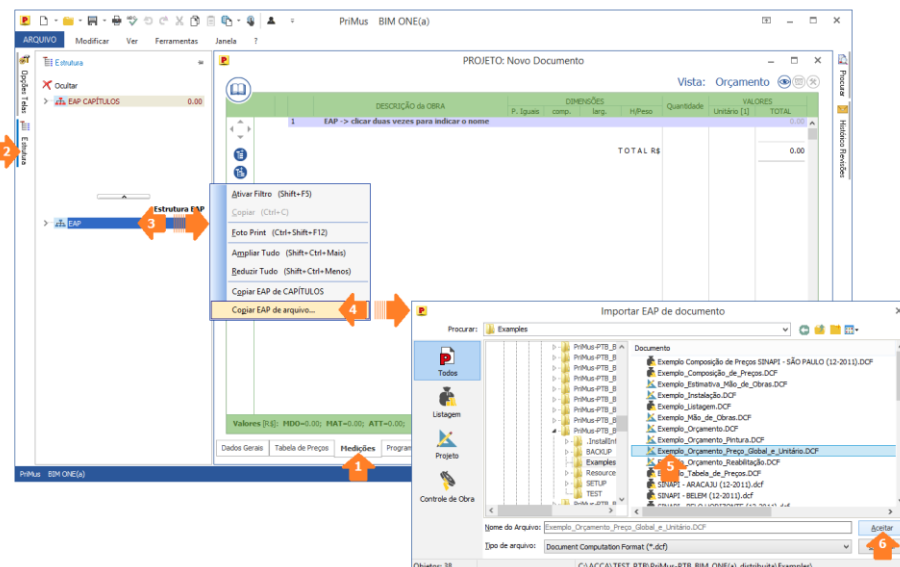

A estrutura da EAP do orçamento pode ser adquirida a partir de outro documento.

Após ter sido adquirida, a EAP pode ser modificada e/ou integrada de acordo com as necessidades específicas de cada projeto.

2

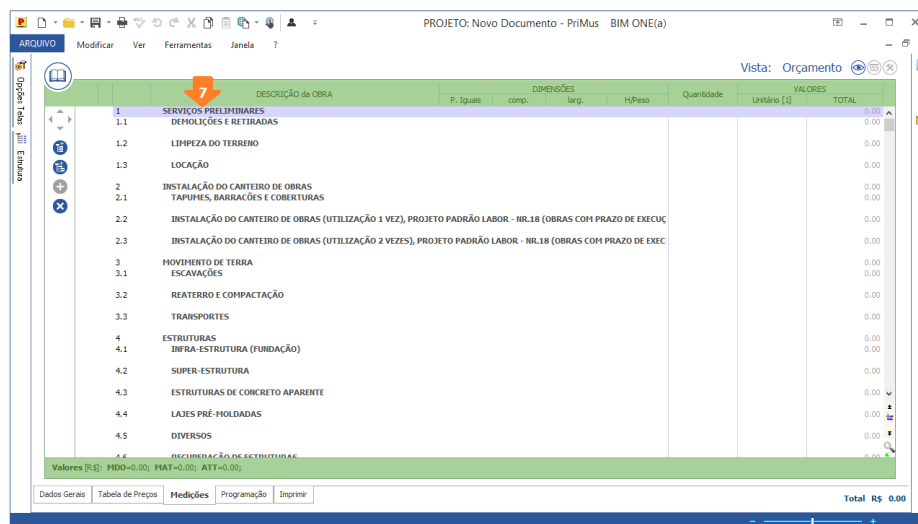


Como adquirir no orçamento a EAP da tabela de preços

STEP


NOTAS

1

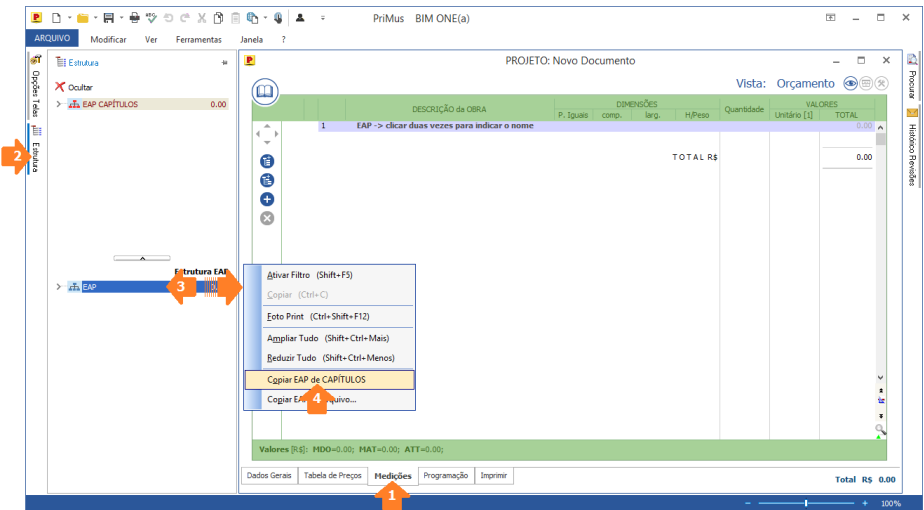

É possível copiar no orçamento a mesma EAP criada anteriormente para estruturar a tabela de preços do documento.

2

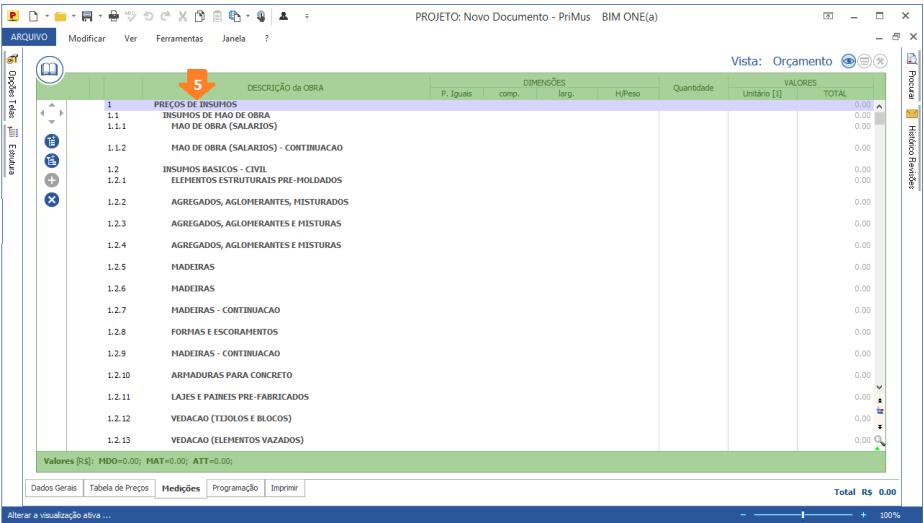


Como adquirir na tabela de preços a EAP do orçamento

STEP


NOTAS

1

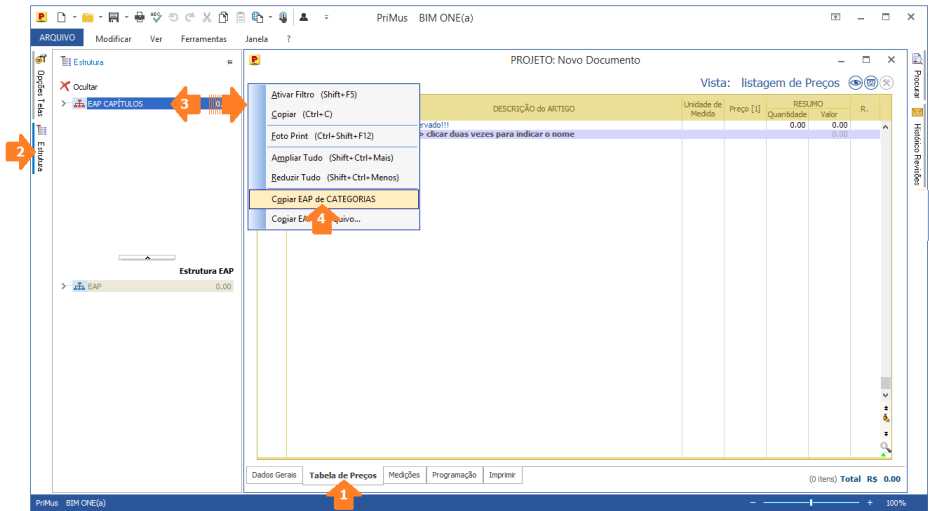

É possível copiar na tabela de preços a estrutura EAP criada no orçamento.

2

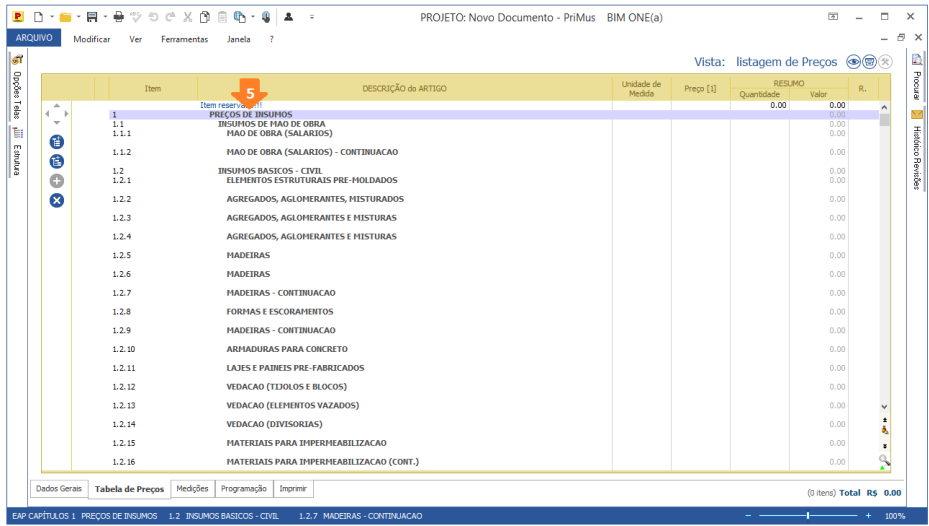


Como adquirir na tabela de preços a EAP da Lista de preços de referência

STEP


NOTAS

1

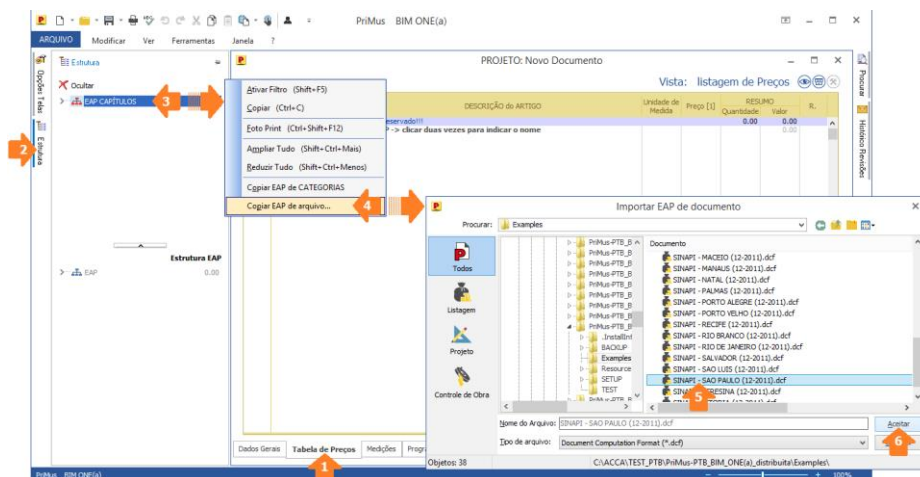

É possível copiar na tabela de preços do orçamento a EAP da lista de preços de referência.

2

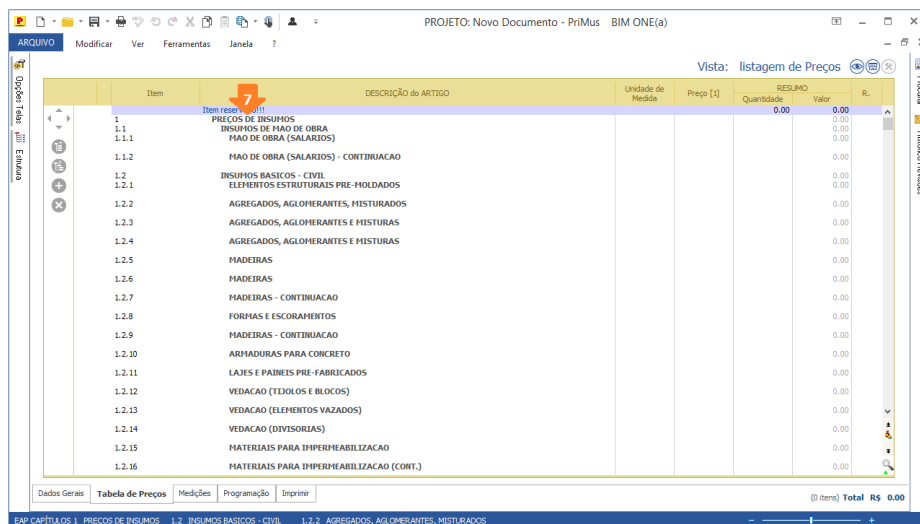


Como criar e orçar um novo serviço diretamente no editor Medições

STEP

NOTAS

1

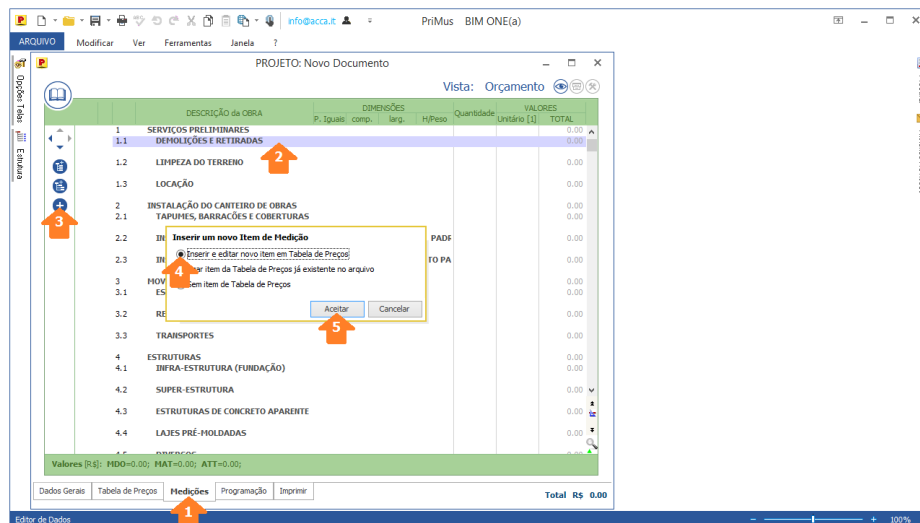


É possível criar e orçar um novo serviço diretamente no editor Medições.

O serviço criado no orçamento será incluído de forma automática pelo software no editor Tabela de preços do documento.

Para criar um novo serviço é preciso:

- selecionar o nó da EAP;
- selecionar o botão  ou a tecla "Ins" do teclado.

2

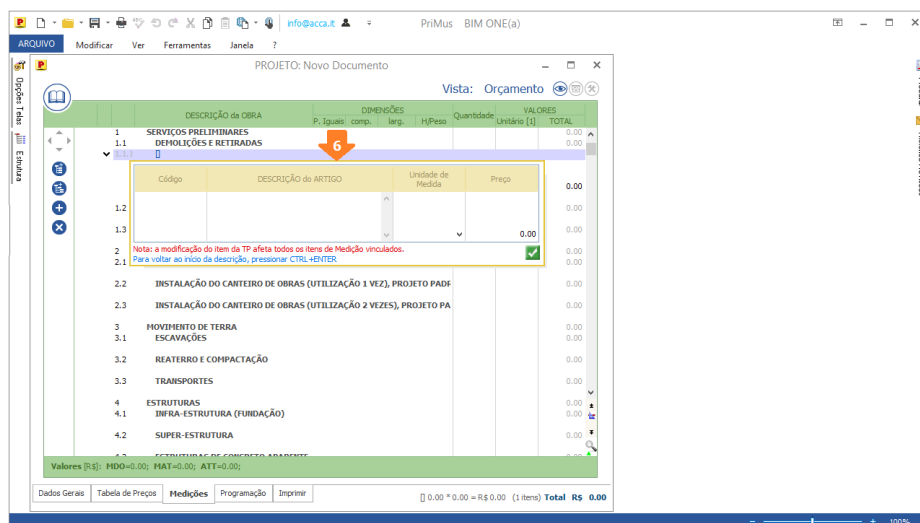

É possível criar e orçar um novo serviço diretamente no editor Medições.

O serviço criado no orçamento será incluído de forma automática pelo software no editor Tabela de preços do documento.

3

PROJETO: Novo Documento

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO DA OBRA	DIMENSÕES	Quantidade	Unidade	VALORES
P. Igual. comp. larg. H/Peso			[1]	TOTAL
1.1.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	0.00	m2	79.00
1.3		0.00		
2		0.00		
2.1		0.00		
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADE	0.00		
2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PA	0.00		
3		0.00		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0.00		
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO	0.00		
3.3	TRANSPORTES	0.00		
4		0.00		
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	0.00		
4.2	SUPER-ESTRUTURA	0.00		
4.3		0.00		

Valores (R\$): HDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

0.00 * 0.00 = R\$ 0.00 (1 item) Total R\$ 0.00

Preencher os dados que caracterizam o serviço:

- Código de Tarifa;
- Descrição detalhada;
- Unidade de medida;
- Preço unitário.

4

PROJETO: Novo Documento

Vista: Orçamento


DESCRIÇÃO DA OBRA	DIMENSÕES	Quantidade	Unidade	VALORES
P. Igual. comp. larg. H/Peso			[1]	TOTAL
1.1.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	0.00	m2	79.00
1.2		0.00		
1.3		0.00		
2		0.00		
2.1		0.00		
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADE	0.00		
2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PA	0.00		
3		0.00		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0.00		
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO	0.00		
3.3	TRANSPORTES	0.00		
4		0.00		
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	0.00		
4.2	SUPER-ESTRUTURA	0.00		
4.3		0.00		

Valores (R\$): HDO=0.00; MAT=0.00; ATT=0.00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir


0.00 * 79.00 = R\$ 0.00 (1 item) Total R\$ 0.00

5

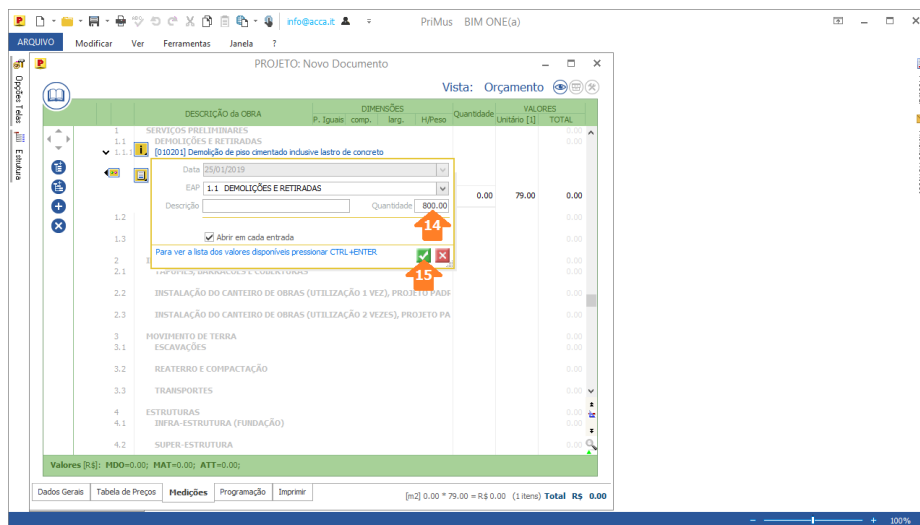


Indicar a quantidade total...

6

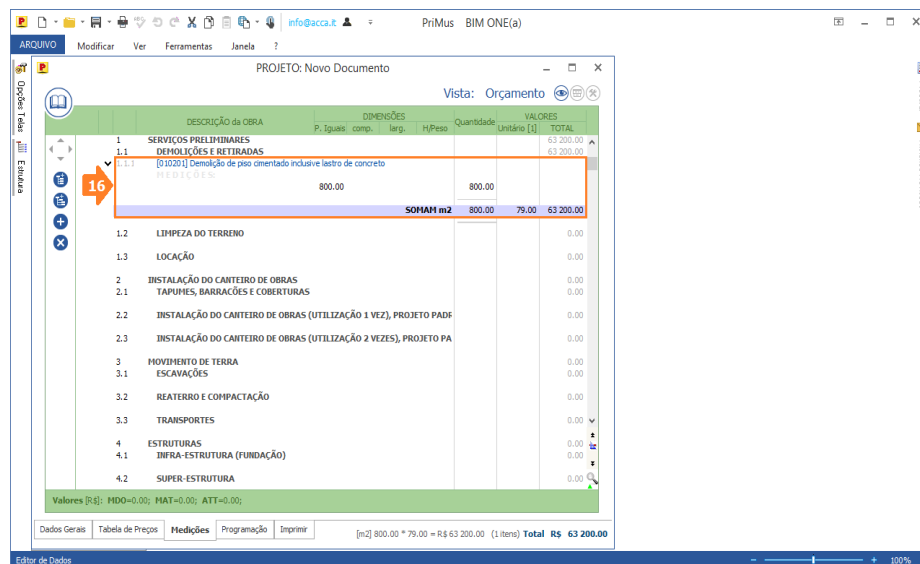


Como inserir as medidas em vez da quantidade total

7

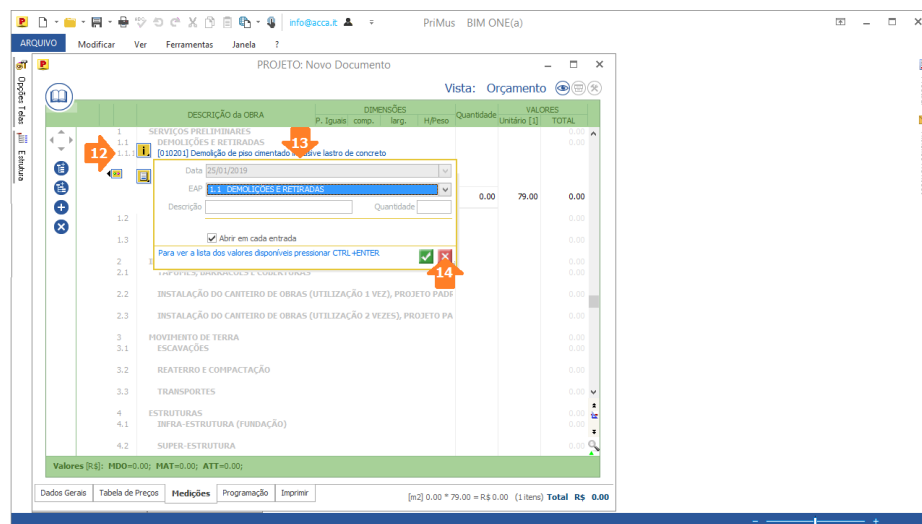

Em vez da quantidade total...

8

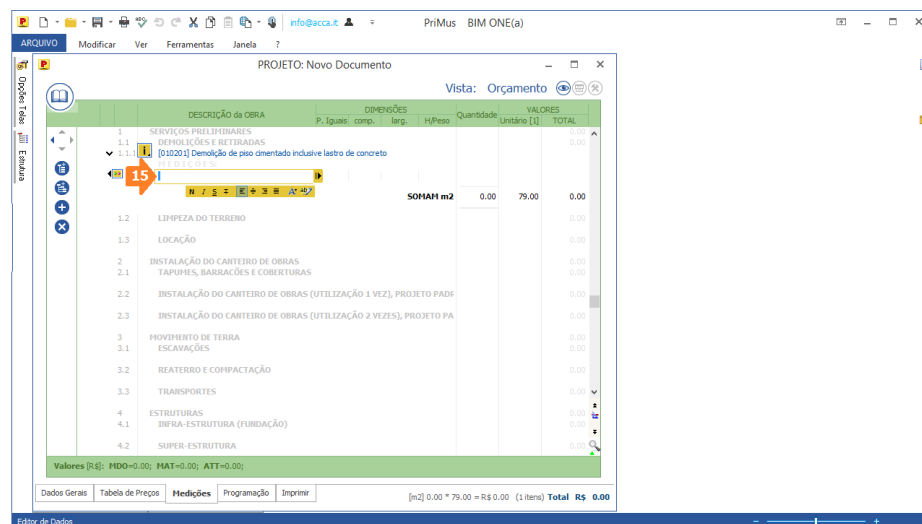

...é possível acessar o editor das medidas...

9

PROJETO: Novo Documento

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO DA OBRA	P. Igual	comp.	larg.	H/Peso	Quantidade	Unidade [1]	VALORES	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								19 671,00
1.1 REPERIÇÕES E RETIRADAS								19 671,00
1.1.1 [010201] Demolição de piso orientado inclusive lastro de concreto								
Lado norte	10.00	6.00			3.100		186,00	
		5.00			7.000		-35,00	
Lado sul	6.00	2.00			4.000		48,00	
		10.00			5.000		50,00	
* Parcial m2							151,00	
* Parcial m2							98,00	
SOMAM m2					249,00		79,00	19 671,00
1.2 LIMPEZA DO TERRENO								0,00
1.3 LOCAÇÃO								0,00
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								0,00
2.1 TAPUPES, BARRAÇÕES E COBERTURAS								0,00
2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADE								0,00
2.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PA								0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA								0,00
3.1 ESCAVAÇÕES								0,00
3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO								0,00

Valores [R\$]: HDO=0,00; HAT=0,00; ATT=0,00;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir [m2] 249,00 * 79,00 = R\$ 19 671,00 (1 item) Total R\$ 19 671,00

...no qual é possível descrever de forma detalhada as dimensões.

10

PROJETO: Novo Documento

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO DA OBRA	P. Igual	comp.	larg.	H/Peso	Quantidade	Unidade [1]	VALORES	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								19 671,00
1.1 REPERIÇÕES E RETIRADAS								19 671,00
1.1.1 [010201] Demolição de piso orientado inclusive lastro de concreto								
Lado norte	10.00	6.00			3.100		186,00	
		5.00			7.000		-35,00	
Lado sul	6.00	2.00			4.000		48,00	
		10.00			5.000		50,00	
* Parcial m2							151,00	
* Parcial m2							98,00	
SOMAM m2					249,00		79,00	19 671,00
1.2 LIMPEZA DO TERRENO								0,00
1.3 LOCAÇÃO								0,00
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								0,00
2.1 TAPUPES, BARRAÇÕES E COBERTURAS								0,00
2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADE								0,00
2.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PA								0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA								0,00
3.1 ESCAVAÇÕES								0,00
3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO								0,00

Valores [R\$]: HDO=0,00; HAT=0,00; ATT=0,00;


Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir [m2] 249,00 * 79,00 = R\$ 19 671,00 (1 item) Total R\$ 19 671,00

Como orçamentar os serviços adquiridos a partir da Lista de preços de referência

ETAPA

NOTAS

1

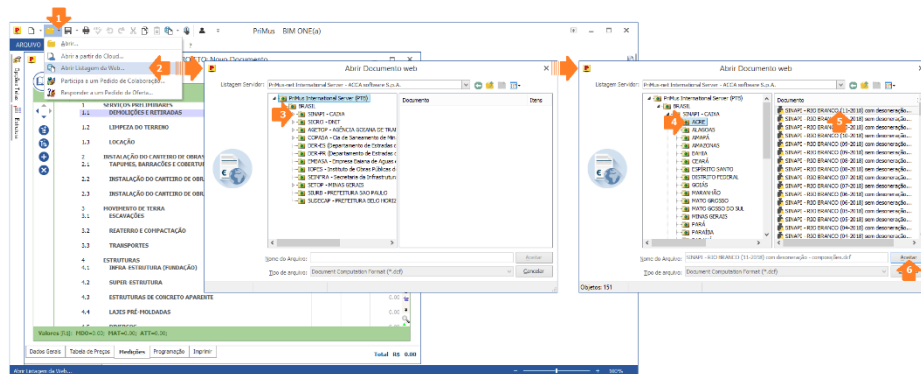


Para orçamentar os serviços de uma Lista de preços, é necessário abrir na tela quer o orçamento quer a lista de preços de referência.

É possível abrir as Listas de preços utilizadas no Brasil diretamente a partir dos servidores da ACCA...

As Listas de preços utilizadas no Brasil, incluindo as composições, são periodicamente atualizadas e disponibilizadas no formato PriMus.

2

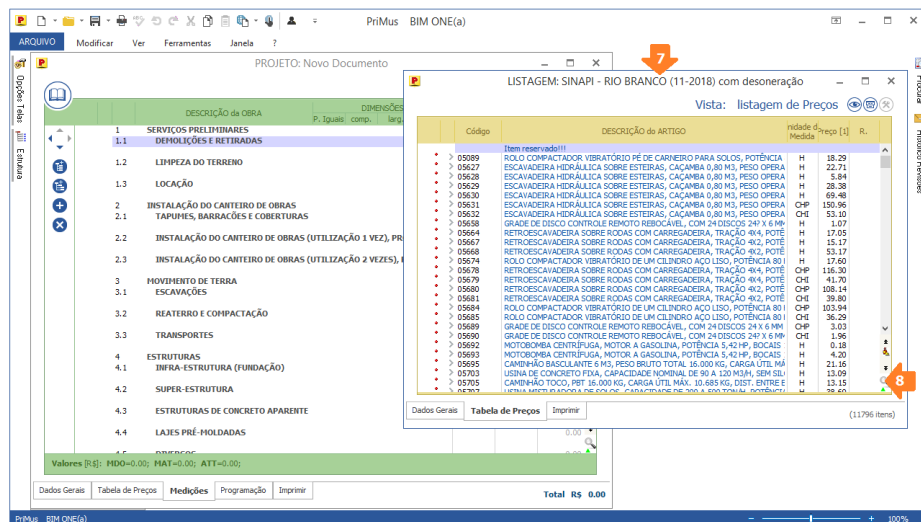


Arranjar os dois documentos na tela de forma a obter a Lista de preços num lado e o orçamento no outro.

A partir da Lista de preços:

- pesquisar o serviço desejado;
- arrastar e soltar o serviço em questão diretamente no orçamento.


3

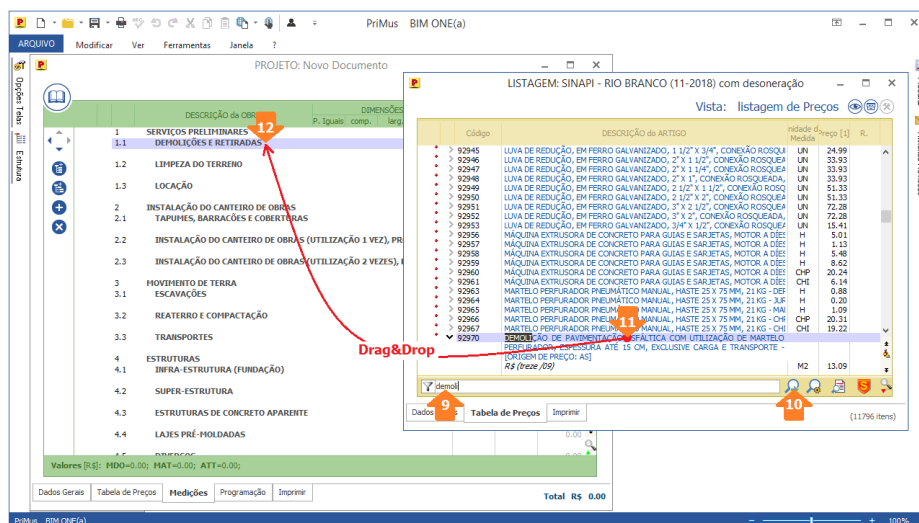

No dialog que irá aparecer é possível indicar diretamente a quantidade total.

Cancelando (clicar na X)...

4

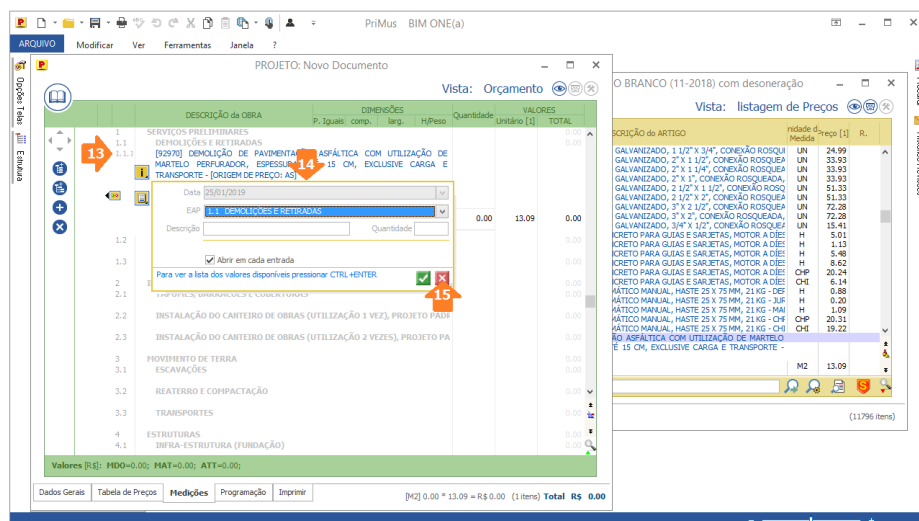

...é possível acessar o editor das linhas de medição do serviço...

5

The screenshot shows the software interface with two main windows. The left window, titled 'Vista: Orçamento', displays a table of items with columns for 'DESCRIÇÃO DA OBRA', 'DIMENSÕES', 'Quantidade', 'Unidade', and 'VALORES'. Item 1.1.1 is highlighted, showing a description of 'DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE'. The right window, titled 'Vista: listagem de Preços', shows a detailed list of materials and their prices, including 'GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUIA' and 'CRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL'.

...no qual inserir o detalhe das medidas.

6

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with a more detailed view of item 1.1.1. The 'Vista: Orçamento' window shows a table with columns for 'DESCRIÇÃO DA OBRA', 'DIMENSÕES', 'Quantidade', 'Unidade', and 'VALORES'. Item 1.1.1 is highlighted, showing a description of 'DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE'. The right window, titled 'Vista: listagem de Preços', shows a detailed list of materials and their prices, including 'GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUIA' and 'CRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL'.

7

Projeto: Novo Documento

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO DA OBRA	P. Igual	comp.	larg.	H/Peso	Quantidade	Unidade [U]	VALORES	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								3 259.41
1.1. DESMOLHES E RETIRADAS								3 259.41
[02970] DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFORADOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - [ORIGEM DE PREÇO: AS]								
Lado norte	10.00	6.00		3.100	186.00			
		5.00		7.000	-35.00			
Lado sul	6.00	2.00		4.000	48.00			
	10.00	5.000			50.00			
* Parcial M2					151.00			
* Parcial M2					98.00			
SOMAM M2					249.00	13.09		3 259.41
1.2. LIMPEZA DO TERRENO								0.00
1.3. LOCAÇÃO								0.00
2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								0.00
2.1. TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS								0.00
2.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADR								0.00
2.3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PA								0.00
3. MOVIMENTO DE TERRA								0.00
3.1. ESCAVAÇÕES								0.00

Valores [R\$:] MDO=1 264.92; MAT=1 469.10; ATT=522.90;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

[M2] 249.00 * 13.09 = R\$ 3 259.41 (1 item) Total R\$ 3 259.41

Editor de Dados

O BRANCO (11-2018) com desoneração

Vista: listagem de Preços

DESCRIÇÃO DO ARTIGO	Unidade	Preço [R\$]	R.
GALVANIZADO, 1 1/2" x 3/4", CONEXÃO ROSQUEJA	UN	24.99	
GALVANIZADO, 2" x 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEJA	UN	33.93	
GALVANIZADO, 2" x 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEJA	UN	33.93	
GALVANIZADO, 2" x 1", CONEXÃO ROSQUEJADA	UN	33.93	
GALVANIZADO, 2 1/2" x 1 1/2", CONEXÃO ROSQ	UN	51.33	
GALVANIZADO, 2 1/2" x 2", CONEXÃO ROSQUEJA	UN	51.33	
GALVANIZADO, 3" x 2", CONEXÃO ROSQUEJA	UN	72.28	
GALVANIZADO, 3 1/4" x 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEJ	UN	15.41	
CRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL	H	5.01	
CRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL	H	1.13	
CRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL	H	5.48	
CRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL	H	8.62	
CRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL	CHP	20.24	
CRETO PARA GUÍAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL	CH	6.14	
MÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DES	H	0.88	
MÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUP	H	0.30	
MÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MAI	H	1.09	
MÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CH	CHP	20.31	
MÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI	CH	19.22	
MO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO			
E 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE			
M2		13.09	

(11796 item)

8

Projeto: Novo Documento.dcf - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO DA OBRA	P. Igual	comp.	larg.	H/Peso	Quantidade	Unidade [U]	VALORES	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								39 193.98
1.1. DESMOLHES E RETIRADAS								19 675.98
[01020] Demolição de piso cimentado inclusive leito de concreto					249.00		79.02	19 675.98
1.2. LIMPEZA DO TERRENO								618.00
[01040] Corte de capoteira fina, a face (manual)					600.00	1.03		618.00
1.3. LOCAÇÃO								18 900.00
[01050] Locação de obra com gabarito de madeira					1 000.00	18.90		18 900.00
2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								57 835.30
2.1. TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS								7 774.80
[02030] Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOFES					30.00	259.16		7 774.80
2.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUC								28 306.50
[02070] Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontealete 8x8cm, piso cimentado e cobertur					50.00	566.13		28 306.50
2.3. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRAZO DE EXEC								21 774.00
[02080] Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontealete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de					50.00	435.48		21 774.00
3. MOVIMENTO DE TERRA								6 081.79
3.1. ESCAVAÇÕES								6 081.79
[03010] Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade					143.00	42.53		6 081.79
3.2. REATERRO E COMPACTAÇÃO								0.00
3.3. TRANSPORTES								0.00
4. ESTRUTURAS								76 212.44
4.1. INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)								76 212.44
[04020] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto cíclico Fck=19MPa com 30% de pedra de mão					164.00	464.71		76 212.44

Valores [R\$:] MDO=28 300.11; MAT=81 885.85; ATT=594.76;

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

[m2] 249.00 * 79.02 = R\$ 19 675.98 (8 item) Total R\$ 179 343.51

Valores [R\$:] MDO = 28 300.11; MAT = 81 885.85; ATT = 594.76

Os serviços arrastados da Lista de preços e soltados no orçamento...

PROJETO: 'Novo Documento.dcf' - PriMus BIM ONE(a)

Vista: listagem de Preços

Item	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	Unidade de Medida	Preço [1]	RESUMO		R.
				Quantidade	Valor	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				39 193,98	
2.1.1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS				19 675,98	
> 2.1.1.1	[010201] Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	79.02	249.00	19 675,98	
2.1.2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS				0,00	
2.1.3	LIMPEZA DO TERRENO				618,00	
> 2.1.3.1	[012401] Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m2	1.03	600.00	618,00	
2.1.4	LOCAÇÃO				18 900,00	
> 2.1.4.1	[010301] Locação de obra com gabarito de madeira	m2	18.90	1 000.00	18 900,00	
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				57 855,30	
> 2.2.1	TAPUIHES, BARRACÕES E COBERTURAS				7 774,80	
> 2.2.1.1	[020302] Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão TOPES	m2	259.16	30.00	7 774,80	
> 2.2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OE				28 306,50	
> 2.2.2.1	[020701] Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8	m2	566.13	50.00	28 306,50	
> 2.2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (				21 774,00	
> 2.2.3.1	[020801] Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x80	m2	435.48	50.00	21 774,00	
2.3	MOVIMENTO DE TERRA				6 081,79	
> 2.3.1	ESCAVAÇÕES				6 081,79	
> 2.3.1.1	[030101] Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	42.53	143.00	6 081,79	
2.3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO				0,00	
2.3.3	TRANSPORTES				0,00	
2.4	ESTRUTURAS				76 212,44	
> 2.4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)				76 212,44	
> 2.4.1.1	[040202] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=19MPa com 30% de pedra de mão	m3	464.71	164.00	76 212,44	
> 2.4.2	SUPER-ESTRUTURA				0,00	
> 2.4.2.1	[040315] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já inc	m3	618.54	0.00	0,00	
2.4.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE				0,00	
2.4.4	REVESTIMENTOS				0,00	
				(0% item)	Total	R\$ 179 343,51

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Editor de Dados

...são incluídos, de forma automática, na Tabela de preços do documento.

Como orçamentar os serviços já existentes na tabela de preços do mesmo documento

ETAPA

NOTAS

1

PROJETO: 'Novo Documento.dcf' - PriMus BIM ONE(a)

Vista: Orçamento

DESCRIÇÃO da OBRA	P. Iguais	comp.	larg.	H/Peso	Quantidade	Unidade [U]	VALORES	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
[010201] Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto								
					249.00	79.02	19 675.98	
1.2.1.1 LIMPEZA DO TERRENO								
[010401] Corte de capoeira fina, a foice (manual)								
					600.00	1.03	618.00	
1.3.1.1 LOCAÇÃO								
[010501] Locação de obra com gabarito de madeira								
					1 000.00	18.90	18 900.00	
2.1.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								
TAPUBES, BARRACÕES E COBERTURAS								
[020305] Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOFES								
					30.00	259.16	7 774.80	
2.2.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NRI.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECU								
[020701] Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalite 8x8cm, piso cimentado e cobertura de								
					50.00	566.13	28 306.50	
2.3.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NRI.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXEC								
[020801] Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalite 8x8cm, piso cimentado e cobertura de								
					50.00	435.48	21 774.00	
3.1.1.1 MOVIMENTO DE TERRA								
ESCAVAÇÕES								
[030101] Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade								
					143.00	42.53	6 081.79	
3.2.1.1 REATERRO E COMPACTAÇÃO								
TRANSPORTES								
							0.00	
4.1.1.1 ESTRUTURAS								
INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)								
[040202] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto cúbico Fcd=19MPa com 30% de pedra de mão								
					164.00	464.71	76 212.44	
Valores [R\$]: MDO=28 300.11; MAT=81 885.85; ATT=594.76;								
Total R\$ 179 343.51								

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

Os serviços já existentes na tabela de preços do documento podem ser arrastados e soltados para o orçamento.

2

PROJETO: 'Novo Documento.dcf' - PriMus BIM ONE(a)

Medições

Código	DESCRIÇÃO do ARTIGO	Unidade de Medida	Preço	Quantidade	RESUMO	Valor
Item reservado!!!						
010201	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	79.02	249.00	19 675.98	
010401	Corte de capoeira fina, a foice (manual)	m2	1.03	600.00	618.00	
010501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	18.90	1 000.00	18 900.00	
020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOFES	m2	259.16	30.00	7 774.80	
020701	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalite 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibra	m2	566.13	50.00	28 306.50	
020801	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalite 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibra	m2	435.48	50.00	21 774.00	
030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	42.53	143.00	6 081.79	
040202	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto cúbico Fcd=19MPa com 30% de pedra de mão	m3	464.71	164.00	76 212.44	
040115	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fcd = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	618.94	0.00	0.00	
170399	Carroça para vólula de descarga, marcas de referência Fabimar, Doca ou Docal	und	59.99	0.00	0.00	
010101	AJUDANTE	H	5.42	0.00	0.00	
010111	CARPINTERO	H	6.42	0.00	0.00	
010115	ELETRICISTA	H	6.42	0.00	0.00	
Valores [R\$]: MDO=28 300.11; MAT=81 885.85; ATT=594.76;						
Total R\$ 179 343.51						

Dados Gerais Tabela de Preços Medições Programação Imprimir

3

Arquivo

Modificar

Ver

Ferramentas

Janela

?

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir</

4

Documentos de Impressão			
N.	GRUPO	n.	Nome Documento
1	Tabela de Preços	1a	Tabela de Preços (padrão)
2	Composição	2a	Composição de Preços
		2b	Composição de Preços com EAP
		2c	Composição de Preços subdividida por tipo de Recurso
		2d	Composição de Preços (Auxiliar)
3	Curva ABC	3a	Curva ABC das Composições
		3b	Curva ABC dos Insumos
		3c	Curva ABC dos Materiais
		3d	Curva ABC da Mão-de-obra
		3e	Curva ABC dos Equipamentos
4	Orçamento	4a	Orçamento resumido
		4b	Orçamento com Mão-de-obra, Materiais e Equipamentos
		4c	Orçamento com BDI
		4d	Orçamento com detalhe das medições
		4e	Orçamento com composição e medições
		4f	Orçamento com total Recursos
		4g	Resumo do orçamento

1	Grupo:	Tabela de Preços
1a	Nome Documento:	Tabela de Preços (padrão)

Cabeçalho

Tabela

exemplo: Município de...

exemplo: Estado de...

Pag. 1

TABELA DE PREÇOS

OBJETO:

CLIENTE:

Data: 01/02/2019

TÉCNICO

PrintEasy - Gerador de Planilhas - Copyright 2008 - PrintEasy S.A.

Pag. 2

Nº Ordem CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	Unidade Medida	PREÇO UNITÁRIO
Nº 1	[010001] Desempenho de piso cimentado inclusive lastro de concreto M3 (concreto extra 02)	m2	79,02
Nº 2	[010402] Corte de capoteira fina, a fio (marul) M3 (sem 03)	m2	1,03
Nº 3	[010501] Lapação de obra compósito de madeira M3 (decimo 90)	m2	18,90
Nº 4	[010502] Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SOPES M3 (decimo e cinquenta e sete 16)	m2	259,16
Nº 5	[010701] Barroco para muro com sanitário área de 14,50 m2, de chapa de compens. 12mm e postais Indom, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e m. de instalação, conf. projeto (1 utilização) M3 (quinhentos e setenta e sete 13)	m2	566,13
Nº 6	[010801] Barroco para muro com sanitário área de 14,50m2, de chapa de compens. 12mm e postais Indom, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e m. de instalação, conf. projeto (2 utilização) M3 (quatrocentos e trinta e cinco 48)	m2	435,48
Nº 7	[010101] Barroco mural em material de 1ª categoria, em 1,50 m de profundidade M3 (quarenta e dois 53)	m3	42,53
Nº 8	[014002] Formejamento, preparo e aplicação de concreto ciclopico Fcd=13MPa com 10% de pedra e m3 M3 (quatrocentos e setenta e quatro 71)	m3	464,71
Nº 9	[014012] Formejamento, preparo e aplicação de concreto Fcd=10 MPa (concreto 1 e 2) - (% de pedras já incluído no custo) M3 (setecentos e dezoito 54)	m3	618,54
Nº 10	[110542] Canopia para veículo de carga, marca de fabricação Fabrimar, Deca ou Docol M3 (doiscentos e nove 69)	und	59,69
Nº 11	[200101] ATUDANTE M3 (dois 42)	H	5,42
Nº 12	[200111] CARPENTEIRO M3 (dois 42)	H	6,42
Nº 13	[200115] ELETRICISTA M3 (dois 42)	H	6,42
Nº 14	[200118] ENCANADOR M3 (dois 42)	H	6,42
Nº 15	[200121] ARNADOR M3 (dois 42)	H	6,42
Nº 16	[200139] PEDREIRO M3 (dois 42)	H	6,42
Nº 17	[200140] PINTOR M3 (dois 42)	H	6,42
Nº 18	[200145] BREVENTE M3 (quatro 72)	H	4,72
Nº 19	[200150] TELHADEISTA M3 (dois 42)	H	6,42
Nº 20	[200151] AREIA LAVADA MÉDIA M3 (doiscentos e cinco 75)	M3	58,75
Nº 21	[200155] CALHEIRATADO P/ ARGAMASSA CH II M3 (seis 66)	KG	0,66
Nº 22	[200158] CIMENTO PORTLAND CP II - 40 M3 (seis 36)	KG	0,36
Nº 23	[200117] BRITA 1 M3 (seiscentos 02)	M3	70,02
Nº 24	[200118] BRITA 2 M3 (seiscentos 02)	M3	70,02

CLIENTE:

Conteúdo da Tabela

Este documento inclui os serviços presentes na tabela de preços do orçamento (das definições de impressão é possível customizar a tabela e optar, por exemplo, por escolher apenas os serviços utilizados no orçamento, etc.).

Dados

Para cada serviço está incluído: código de tarifa, descrição, unidade de medida e preço unitário.

Ordem

Os serviços, na ausência da EAP, estão ordenados de forma automática de acordo com o código de tarifa.

Customização

A partir das definições de impressão é possível customizar a tabela. Por exemplo:

- imprimir apenas os serviços utilizados no orçamento, etc.;
- visualizar a EAP da tabela de preços;
- adicionar e/ou remover colunas entre as disponíveis;
- etc.

[illegible]

Conteúdo da Tabela

Este documento inclui apenas os serviços com composição utilizados no orçamento subdivididos de acordo com a EAP da tabela de preços.

Dados

Para cada serviço estão incluídos todos os elementos que contribuem na definição do preço unitário (insumos, composição auxiliar, Encargos Sociais, BDI, etc.).

Ordem

Os serviços estão ordenados de forma automática de acordo com a EAP da tabela de preços.

Customização

Das definições de impressão é possível customizar a tabela. Por exemplo:

- imprimir todas as composições presentes na tabela de preços, etc.;
- optar por não visualizar a EAP, etc.;
- adicionar e/ou remover colunas entre as disponíveis;
- etc.

[illegible]

Conteúdo da Tabela

Este documento inclui apenas os serviços com composição utilizados no orçamento.

Dados

Para cada serviço são indicados todos os elementos que contribuem para determinar o preço unitário (insumos, composição auxiliar, Encargos Sociais, BDI, etc.) subdivididos por tipo de recurso (Materiais, Mão de obra, Equipamentos, etc.).

Ordem

Os serviços são ordenados de forma automática de acordo com a EAP da lista de preços.

Customização

Das definições de impressão é possível customizar a tabela. Por exemplo:

- imprimir todas as composições presentes na tabela de preços, etc.;
- escolher um modelo diferente (tabela) entre os disponíveis;
- optar por não visualizar a EAP, etc.;
- adicionar e/ou remover colunas entre as disponíveis;
- etc.

[illegible]

- adicionar e/ou remover colunas entre as disponíveis;
- etc.

4	Grupo:	Orçamento																																																																																																																																																								
4a	Nome Documento:	Orçamento resumido																																																																																																																																																								
Cabeçalho		Tabela																																																																																																																																																								
exemplo: Município de... exemplo: Estado de... OBJETO: CLIENTE: ORÇAMENTO Data, 01/02/2019 TÉCNICO		BDI (Despesa + Despesas Indiretas): 22.32 % <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nº Ordem Código</th><th rowspan="2">DESCRIÇÃO DA OBRA</th><th rowspan="2">Unidade de Medida</th><th rowspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">VALORES</th></tr> <tr> <th>Unitário</th><th>TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; background-color: #d9ead3;">TRANSFERIR</td></tr> <tr> <td>1</td><td>SERVÇOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1.1</td><td>[010201] Demolição de piso cimentado incluindo lauro de concreto</td><td>m²</td><td>281,04</td><td>79,02</td><td>22.207,78</td></tr> <tr> <td>1.2</td><td>LIMPEZA DO TERRENO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.2.1</td><td>[010401] Corte de capoteira fixa, a foice (manual)</td><td>m²</td><td>600,00</td><td>1,03</td><td>618,00</td></tr> <tr> <td>1.3</td><td>LOCAÇÃO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.3.1</td><td>[010501] Locação de obra com galpão de madeira</td><td>m²</td><td>1.900,00</td><td>18,90</td><td>18.900,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.1.1</td><td>[020302] Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão 20PES</td><td>m²</td><td>30,00</td><td>239,18</td><td>7.174,80</td></tr> <tr> <td>2.2</td><td>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ); PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRazo DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.2.1</td><td>[020701] Escanço para escorinho com sanitário área de 14,50m², de chapas de compres. 12mm e pontalão 3x10cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. firm, incl. ponto de luz e ca. de esgoto, conf. projeto (utilização)</td><td>m²</td><td>50,00</td><td>566,15</td><td>28.306,50</td></tr> <tr> <td>2.3</td><td>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 Vezes); PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRazo DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1</td><td>[020801] Escanço para escorinho com sanitário área de 14,50m², de chapas de compres. 12mm e pontalão 3x10cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. firm, incl. ponto de luz e ca. de esgoto, conf. projeto (utilização)</td><td>m²</td><td>50,00</td><td>435,48</td><td>21.774,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>MOVIMENTO DE TERRA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.1</td><td>ESCOVAÇÕES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.1.1</td><td>[030101] Escavação manual em material da categoria, até 1,50 m de profundidade</td><td>m³</td><td>143,00</td><td>42,25</td><td>6.081,79</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ESTRUTURAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4.1</td><td>INFRA-ESTRUTURA (FUNDADAÇÃO)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4.1.1</td><td>[040202] Fomento, preparo e aplicação de concreto aditivo Fibra 50Kg/m com 10% de pedr. de máo.</td><td>m³</td><td>164,00</td><td>464,71</td><td>76.212,44</td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL R\$</td><td></td><td>181.875,31</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; font-size: small;">Data, 01/02/2019 Técnico</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; background-color: #d9ead3;">TRANSFERIR</td></tr> </tbody> </table>	Nº Ordem Código	DESCRIÇÃO DA OBRA	Unidade de Medida	Quantidade	VALORES		Unitário	TOTAL	TRANSFERIR						1	SERVÇOS PRELIMINARES					1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.1.1	[010201] Demolição de piso cimentado incluindo lauro de concreto	m ²	281,04	79,02	22.207,78	1.2	LIMPEZA DO TERRENO					1.2.1	[010401] Corte de capoteira fixa, a foice (manual)	m ²	600,00	1,03	618,00	1.3	LOCAÇÃO					1.3.1	[010501] Locação de obra com galpão de madeira	m ²	1.900,00	18,90	18.900,00	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS					2.1.1	[020302] Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão 20PES	m ²	30,00	239,18	7.174,80	2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ); PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRazo DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)					2.2.1	[020701] Escanço para escorinho com sanitário área de 14,50m ² , de chapas de compres. 12mm e pontalão 3x10cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. firm, incl. ponto de luz e ca. de esgoto, conf. projeto (utilização)	m ²	50,00	566,15	28.306,50	2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 Vezes); PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRazo DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)					2.3.1	[020801] Escanço para escorinho com sanitário área de 14,50m ² , de chapas de compres. 12mm e pontalão 3x10cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. firm, incl. ponto de luz e ca. de esgoto, conf. projeto (utilização)	m ²	50,00	435,48	21.774,00	3	MOVIMENTO DE TERRA					3.1	ESCOVAÇÕES					3.1.1	[030101] Escavação manual em material da categoria, até 1,50 m de profundidade	m ³	143,00	42,25	6.081,79	4	ESTRUTURAS					4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDADAÇÃO)					4.1.1	[040202] Fomento, preparo e aplicação de concreto aditivo Fibra 50Kg/m com 10% de pedr. de máo.	m ³	164,00	464,71	76.212,44	TOTAL R\$					181.875,31	Data, 01/02/2019 Técnico						TRANSFERIR					
Nº Ordem Código	DESCRIÇÃO DA OBRA	Unidade de Medida					Quantidade	VALORES																																																																																																																																																		
			Unitário	TOTAL																																																																																																																																																						
TRANSFERIR																																																																																																																																																										
1	SERVÇOS PRELIMINARES																																																																																																																																																									
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																																																																																																																																									
1.1.1	[010201] Demolição de piso cimentado incluindo lauro de concreto	m ²	281,04	79,02	22.207,78																																																																																																																																																					
1.2	LIMPEZA DO TERRENO																																																																																																																																																									
1.2.1	[010401] Corte de capoteira fixa, a foice (manual)	m ²	600,00	1,03	618,00																																																																																																																																																					
1.3	LOCAÇÃO																																																																																																																																																									
1.3.1	[010501] Locação de obra com galpão de madeira	m ²	1.900,00	18,90	18.900,00																																																																																																																																																					
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS																																																																																																																																																									
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS																																																																																																																																																									
2.1.1	[020302] Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão 20PES	m ²	30,00	239,18	7.174,80																																																																																																																																																					
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ); PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRazo DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)																																																																																																																																																									
2.2.1	[020701] Escanço para escorinho com sanitário área de 14,50m ² , de chapas de compres. 12mm e pontalão 3x10cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. firm, incl. ponto de luz e ca. de esgoto, conf. projeto (utilização)	m ²	50,00	566,15	28.306,50																																																																																																																																																					
2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 Vezes); PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRazo DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)																																																																																																																																																									
2.3.1	[020801] Escanço para escorinho com sanitário área de 14,50m ² , de chapas de compres. 12mm e pontalão 3x10cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. firm, incl. ponto de luz e ca. de esgoto, conf. projeto (utilização)	m ²	50,00	435,48	21.774,00																																																																																																																																																					
3	MOVIMENTO DE TERRA																																																																																																																																																									
3.1	ESCOVAÇÕES																																																																																																																																																									
3.1.1	[030101] Escavação manual em material da categoria, até 1,50 m de profundidade	m ³	143,00	42,25	6.081,79																																																																																																																																																					
4	ESTRUTURAS																																																																																																																																																									
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDADAÇÃO)																																																																																																																																																									
4.1.1	[040202] Fomento, preparo e aplicação de concreto aditivo Fibra 50Kg/m com 10% de pedr. de máo.	m ³	164,00	464,71	76.212,44																																																																																																																																																					
TOTAL R\$					181.875,31																																																																																																																																																					
Data, 01/02/2019 Técnico																																																																																																																																																										
TRANSFERIR																																																																																																																																																										

CLIENTE: [Exemplo_VBS_Stamp_3_dcf ©:\ACC\ATEST_PTB\Fin\cu-PTB_BM_ONe(a)\demo\boite TEST"] v1.8)

4

4c

Nome Documento:

Grupo:

Orçamento

Cabeçalho

Tabela

exemplo: Município de...

exemplo: Estado de...

Pág. 1

ORÇAMENTO
COM BDI

OBJETO:

CLIENTE:

Data, 01/02/2019

TÉCNICO

Protecky Guiti Construt - copyright ACCI Software S.A.

BID (Benefício e Despesas Indiretas): 22.32 %

Pág. 2

Nº Ordem Item

DESCRIÇÃO DA OBRA

Quantidade

PREÇO(R\$)

sem BDI

com BDI

Total com BDI

TRANSFERIR

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1

[010001] Demolição de piso dimensionado inclusive lajeiro de concreto

251,04

64,80

79,02

22.207,78

1.2

LIMPEZA DO TERRENO

1.2.1

[010401] Corte de capoteira fina, a foice (manuseio)

600,00

0,84

1,03

618,00

1.3

LOCAÇÃO

1.3.1

[010001] Locação de obra com galinheiro de madeira

1.000,00

15,45

18,90

18.900,00

2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1

FAPUNES, BARBAÇÕES E COBERTURAS

2.1.1

[020001] Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão CORES

30,00

211,87

259,16

7.774,80

2.2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ); PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)

2.2.1

[020701] Barracão para escritório com sanitário área de 14,50m², de água de consumo, 12mm e pontalino fitilum, piso dimensionado e cobertura de telha de fibrocimento, incluído ponto de luz e ex. de suspensão, unif. projeto (1 utilização)

50,00

462,83

566,13

28.306,50

2.3

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VIZES) PROJETO PADRÃO LABOR - NR-18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

2.3.1

[020801] Barracão para escritório com sanitário área de 14,50m², de água de consumo, 12mm e pontalino fitilum, piso dimensionado e cobertura de telha de fibrocimento, incluído ponto de luz e ex. de suspensão, unif. projeto (2 utilização)

50,00

356,02

451,48

21.774,00

3

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

EXCAVAÇÕES

3.1.1

[030001] Escavação manual em material de 1.a categoria, até 1,50 m de profundidade

143,00

34,77

42,53

6.081,79

4

ESTRUTURAS

4.1

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

4.1.1

[040001] Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclopico Fck=12MPa com 10% de pedregulho

164,00

378,91

464,71

76.212,44

Data, 01/02/2019

Técico

.....

TRANSFERIR

CLIENTE [Exemplo_VSB_Stampo_J.def @ ACCATEST_PTPProjeto-PB_NONE(a_documentoTEST)] v1.8]

Conteúdo da Tabela

Este documento inclui apenas os serviços utilizados no orçamento subdivididos de acordo com a EAP do orçamento.

Dados

Para cada serviço são indicados: código e título da EAP, código de tarifa e descrição do serviço, unidade de medida, quantidade total, preço unitário sem BDI, preço unitário com BDI e valor total com BDI. Para além disso, é indicado o valor total do orçamento com BDI.

No cabeçalho das páginas internas (no canto superior esquerdo), se existentes, também é indicada a percentagem de BDI.

Ordem:

Os serviços são ordenados de forma automática de acordo com a EAP do orçamento.

Customização

Das definições de impressão é possível customizar a tabela. Por exemplo:

- optar por não visualizar a EAP, etc.
- adicionar e/ou remover colunas entre as disponíveis;
- etc.

[illegible]

